OTOKAR · AA MÜHENDİSLİK LİDERLİĞİ

Askeri Araçlar Kaynak Yönetimi Sistemi

Kullanıcı Manueli ve Yetki Matrisi

İçindekiler


1. Giriş ve ekran düzeni
2. Roller ve menüler
3. Ana Sayfa, arama ve bildirimler
4. Projeler
5. Proje Takvimi Güncelle
6. Kaynak Planlama
7. Proje ve Kaynak Değerlendirme
8. Haftalık Kritik Konular
9. Raporlar ve Head Count
10. Aktivite Giriş ve takvimler
11. Aktivite Raporu
12. Organizasyon & Çalışan & Yetki
13. Yetki matrisi
14. Sık karşılaşılan durumlar ve sözlük

Belge sürümü	3.4
Tarih	28.10.2026

1. Giriş ve ekran düzeni

Sisteme giriş


1. Uygulama adresini tarayıcıda açın. **Oturum Aç** formunda imleç **Kullanıcı Adı** alanındadır.
2. Kullanıcı adınızı ve **Şifre**'nizi yazıp **Giriş Yap**'a basın. Göz simgesi şifreyi gösterir; Caps Lock açıksa alanın altında uyarı çıkar. Yerel Normal Kullanıcı hesabında **Beni Hatırla** en fazla 30 günlük oturum sağlar; seçilmezse üst sınır 12 saattir. Admin, Yönetici ve Normal-Proje hesaplarında üst sınır 8 saattir ve kalıcı hatırlama uygulanmaz. AD hesaplarında, yüksek yetkili hesaplar dışındaki üst sınır 12 saattir. Bütün hesaplarda 30 dakika hareketsizlik oturumu kapatır; ortak bilgisayarda hatırlamayı seçmeyin.
3. Active Directory hesabıyla kurum şifrenizi kullanırsınız; hesabınıza ayrıca uygulama rolü tanımlanmış olmalıdır. AD şifresi uygulamada yenilenmez; kurumsal parola süresi ve kuralları IT tarafından yönetilir.



Giriş ekranı. Soldaki araç görseli her açılışta değişir.

Ekranın bölümleri


- **Sol menü:** Rolünüzün açabildiği ekranlar gruplar halinde listelenir (Ana Sayfa · planlama ve projeler · raporlar · aktivite · yönetim). Menü başlığındaki düğme menüyü daraltır veya açar.
- **Üst çubuk:** Ana Sayfa'ya döndüren Otokar logosu, açık ekranın adı, **Ara...** kutusu (Ctrl + K), bildirim çanı, kullanıcı menüsü ve **Çıkış**. Üst çubuk sayfa kaydırılsa da görünür kalır.
- **Ekran başlığı ve alt sekmeler:** Bazı ekranlarda başlığın altında alt sekmeler bulunur (örneğin Projeler → **Proje Takvimi Güncelle**). Sağda **Görünüm** seçimi, ekrana özel düğmeler ve indirme (↓) düğmesi yer alır.
- **Filtreler:** Liderlik, Takım, Proje, Kişi, Başlangıç Ayı ve Görünür Dönem gibi seçimler. Tek bir değer seçildiğinde adı, birden fazla seçildiğinde sayısı görünür. **Filtreleri Sıfırla** varsayılana döndürür. Filtre yalnız görünümü daraltır, yetki vermez.
- **Kısa bildirimler:** "Veritabanına kaydedildi" gibi mesajlar sağ altta birkaç saniye görünür; hata mesajları ekranda kalır.



Kullanıcı menüsü: rol, **Varsayılan sekme** (her girişte açılacak ekran, hesabınızda saklanır) ve Admin için veri yedeği işlemleri.

Oturum süresi ve güvenli çalışma

Fare, klavye veya kaydırma ile çalışırken oturum etkinliği yenilenir. Sayfanın açık kalması ve arka planda verilerin otomatik sorgulanması etkinlik sayılmaz.

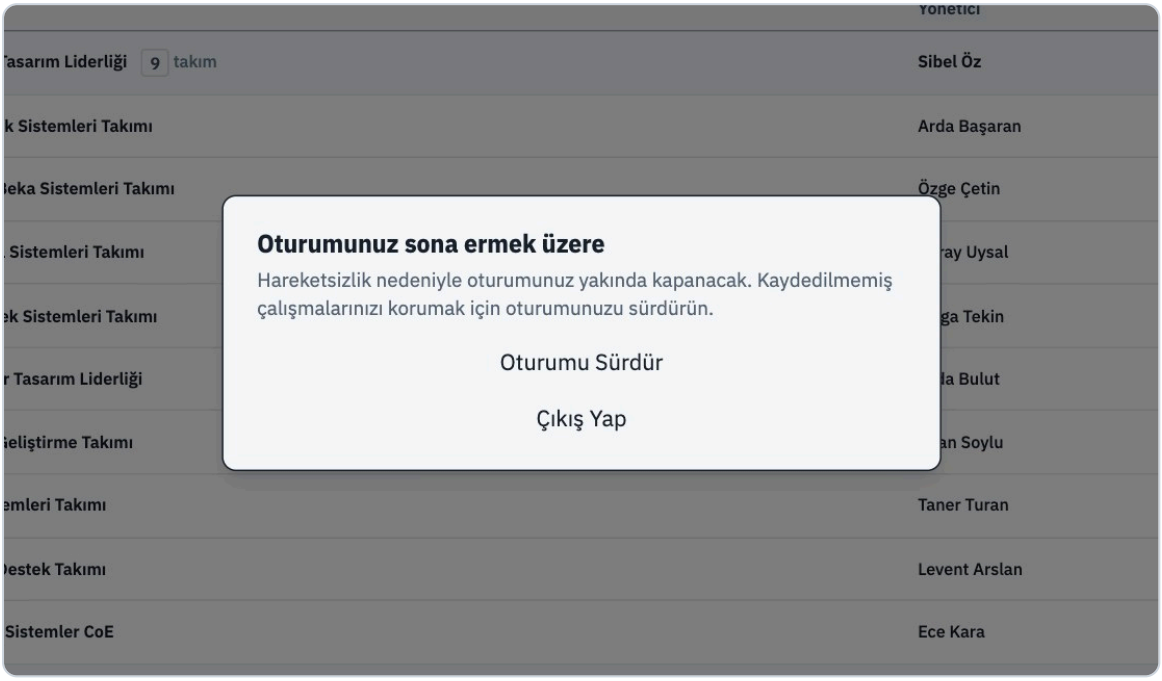

Hareketsizlik sınırından beş dakika önce gösterilen uyarı.

- **Oturumu Sürdür:** Bağlantı varsa hareketsizlik süresini yeniler. Yenilenemezse ekrandaki hatayı kontrol edin.
- **Azami süre:** Hesabınızın 8 saat, 12 saat veya 30 günlük üst sınırı uzatılamaz. Uyarıda **Çalışmayı Kaydetmek İçin Dön** ile kaydınızı tamamlayıp yeniden giriş yapın.
- **Çıkış Yap:** Ortak bilgisayarı bırakmadan önce oturumu kapatın. Süre dolması, kaydedilmemiş verilerin kaydedildiği anlamına gelmez.

> Yerel hesapta ilk kurulumda veya parola sıfırlamasından sonra geçici parola kullanıyorsanız, uygulama yeni parola belirlemenizi ister. Yeni parola 10-256 karakter olmalı, en az bir harf ve bir rakam içermeli; yalnız tekrar veya ardışık dizilerden oluşmamalıdır. Kullanıcı adınız ve örnek belgelerde ya da kaynak kodda yer almış değerler de kabul edilmez.

2. Roller ve menüler

Her hesabın tek bir uygulama rolü vardır. Rol, menüde hangi ekranların görüneceğini ve hangi kayıtların değiştirilebileceğini belirler. Ayrıntılı karşılaştırma 13. bölümdeki yetki matrisindedir.

Admin

Tüm ekranları ve verileri görür, tümünü düzenler. Hedef plan onayı, ay kilidi, uyarı ayarları, senaryo onayı ve takvime aktarma; çalışan, hesap, organizasyon, ortak çalışma takvimi, değişiklik geçmişi ve yedekleme yalnız Admin'dedir.

Yönetici

Kaynak Planlama'da tüm takımları görür, kendisine verilen kapsamda giriş yapar. Kendi liderliklerinin hedef ve gerçekleşen planını girer. Görünür projelerin haftalık kritik başlık, konu ve tarihlerini düzenler; raporları görüntüler ve senaryo taslağı hazırlar.

Normal Kullanıcı

Aktivite Giriş'te çalışan kaydındaki görevine göre kendisinin veya ekibinin aktivitesini ve izin/eğitim takvimini girer. Aktivite Raporu'nu aynı görevden gelen kişi kapsamında, kendisine görünür projeleri proje yetkisine göre görüntüler.

Normal-Proje

Projeler ve Haftalık Kritik Konular ekranlarında Admin ile aynı yetkilere sahiptir: proje ekler, düzenler, siler, sıralar; aşama, başlık, not ve kilometre taşlarını yönetir; proje görüntüleme yetkisini belirler.

Menüdeki ekran	Admin	Yönetici	Normal Kullanıcı	Normal-Proje
Ana Sayfa	✓	✓	✓	✓
Projeler	✓	✓	✓	✓
Kaynak Planlama	✓	✓	–	–
Proje ve Kaynak Değerlendirme	✓	✓	–	–
Haftalık Kritik Konular	✓	✓	–	✓
Raporlar	✓	✓	–	–
Aktivite Giriş	✓	✓	✓	–
Aktivite Raporu	✓	✓	✓	–
Organizasyon & Çalışan & Yetki	✓	–	–	–

Uygulama rolü ekran erişimini, çalışan görevi aktivite kapsamını belirler. Yönetici rolü, Aktivite Giriş ve Aktivite Raporu'nda daha fazla kişiyi görme yetkisi vermez. Bu ekranlarda kapsam, hesaba bağlı çalışan kaydındaki Lider, Product Owner, Team Member veya CoE görevinden gelir. Admin tüm kişilere erişir.

Aktivite Giriş ve Aktivite Raporu kapsamı

Aşağıdaki kişi kapsamı, ekranı açabilen Yönetici ve Normal Kullanıcı hesapları için aynıdır. Aktivite Raporu salt okunurdur; aktivite ve izin/eğitim değişiklikleri Aktivite Giriş'ten yapılır.

Çalışan kaydındaki görev	Aktivite Giriş ve izin/eğitim	Aktivite Raporu
Team Member, CoE	Yalnız kendisi	Kendi takımı
Product Owner	Kendisi ve kendi takımı	Kendisi ve kendi takımı
Lider	Kendisi, kendi liderliği, alt liderlikler ve bağlı takımlar	Kendisi, kendi liderliği, alt liderlikler ve bağlı takımlar
Admin (uygulama rolü)	Herkes	Herkes

Örnek: Çalışan görevi Team Member olan bir Yönetici, Aktivite Giriş'te yalnız kendisini, Aktivite Raporu'nda kendi takımını görür. Çalışan görevi Lider olan bir Normal Kullanıcı ise kendi liderliğine ve alt liderliklere erişir.

> **Çalışan kaydı eşleşmesi gerekir.** Admin dışındaki bir hesap çalışan kaydına bağlı değilse, Yönetici rolünde ve planlama için liderlik yetkisi olsa bile Aktivite Giriş ve Aktivite Raporu boş gelir. Admin, hesap eşleşmesini ve çalışanın görev/takım bilgilerini kontrol etmelidir.

Takım değişikliği geçmiş raporları değiştirmez. Kullanıcının kapsamı bugünkü organizasyon görevinden gelir; her ayın aktivitesi çalışanın o ay bulunduğu takım altında gösterilir. Eski takımın PO/Lideri yalnız o takıma ait ayları, yeni takımın PO/Lideri kendi takımına ait ayları görür. Çalışan, kendi geçmişinin tamamını ilgili takımlar altında görür; eski takım arkadaşlarının verilerine erişmez. Her ay yalnız bir takımın toplamına eklenir.

> **Tamamlanan projeler:** Aktivite Giriş'te gösterme seçimi yalnız görünümü değiştirir. Tamamlanan projelerde de aynı kişi ve ay yetkileri geçerlidir; aylık toplamlar ve kapasite sınırı korunur.


Yönetici planlama yetkisi

Planlanan Kaynak Dağılımı Yetkisi alanındaki liderlik ve takım atamaları Aktivite Giriş veya Aktivite Raporu kapsamını genişletmez.

- **Liderlik yetkisi:** Seçilen liderlik ve altındaki tüm liderlik/takımlar için Kaynak Planlama girişi.
- **Takım yetkisi:** Yalnız seçilen takım için Kaynak Planlama girişi.

3. Ana Sayfa, arama ve bildirimler

Giriş sonrası varsayılan ekran Ana Sayfa'dır. Üst satırda karşılama, rol, tarih ve hafta numarası; altında açabildiğiniz her ekran için başlığını ve simgesini taşıyan bir kart bulunur. Karta tıklamak ilgili ekranı açar. Farklı bir açılış ekranı için kullanıcı menüsündeki **Varsayılan sekme**'yi kullanın.

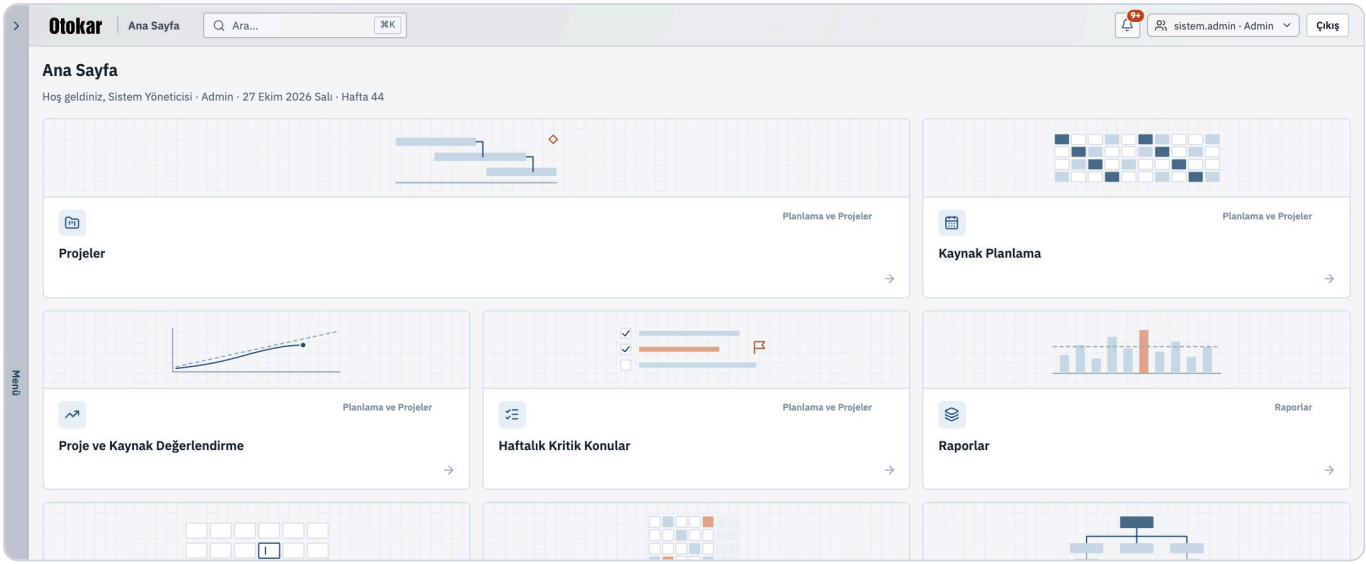


Ana Sayfa (Admin). Kartlar rolünüze göre değişir.

Genel arama (Ctrl+K)


- Üst çubuktaki **Ara...** kutusuna tıklayın veya Ctrl + K (Mac: ⌘ + K) tuşlayın.
- Ekran, proje, liderlik, takım veya kişi adının bir kısmını yazın. Büyük/küçük harf ve Türkçe karakter farkı gözetilmez.
- ↑ ↓ ile seçip Enter'a basın. Seçili satırın sağında nereye gidileceği yazar: proje Projeler'de, liderlik/takım Kaynak Planlama'da, kişi Aktivite Giriş'te ilgili filtreyle açılır. Esc kapatır.
- Yalnız açabildiğiniz ekranlar ve görebildiğiniz kayıtlar listelenir.

Bildirimler

- Çan simgesi, başkalarının kapsamınızdaki son değişikliklerini gösterir: yeni proje, kilometre taşı ve aşama değişiklikleri, hedef plan onayı, aylık gerçekleşen girişi, ay kilidi, senaryo kayıtları.
- Kırmızı rozet okunmamış sayısını gösterir. Liste kapatılınca bildirimler okundu sayılır; bu bilgi tarayıcınızda tutulur.
- Bir bildirime tıklamak ilgili ekranı açar. Aynı kişinin aynı kayıttaki art arda değişiklikleri tek satırda toplanır.

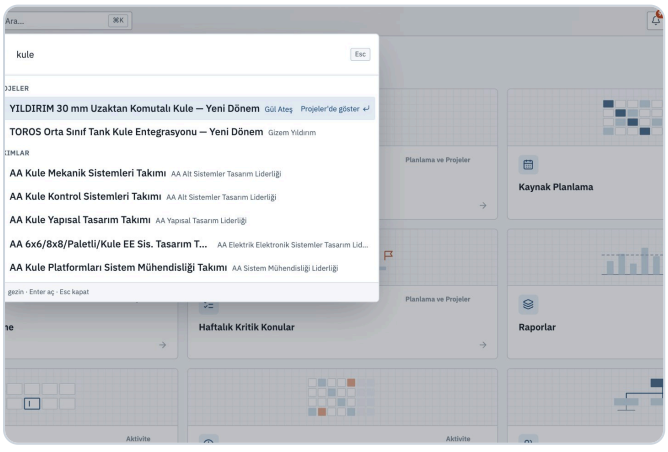


"kule" araması: projeler ve takımlar.

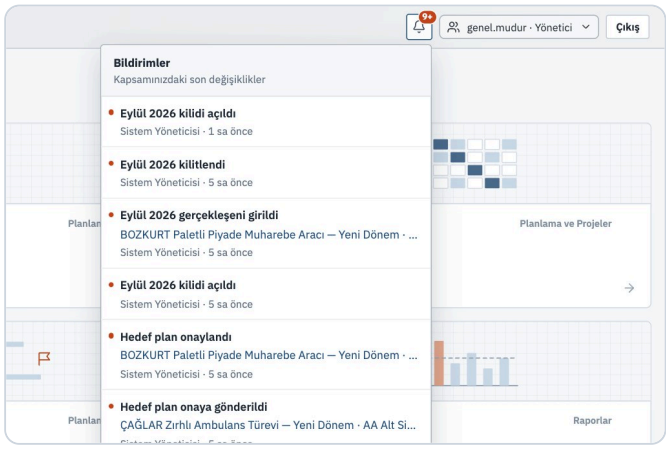

Bildirim listesi (Yönetici).

4. Projeler

Tüm roller görebildiği projeleri burada izler (proje görüntüleme yetkisine tabi). Düzenleme işlemleri **Admin** ve **Normal-Proje** içindir. Satırda proje adı, sorumlusu, dönemi ve aşamaları görünür; kilit simgesi kısıtlı görünürlüğü, sağdaki sayı kritik konu sayısını gösterir.

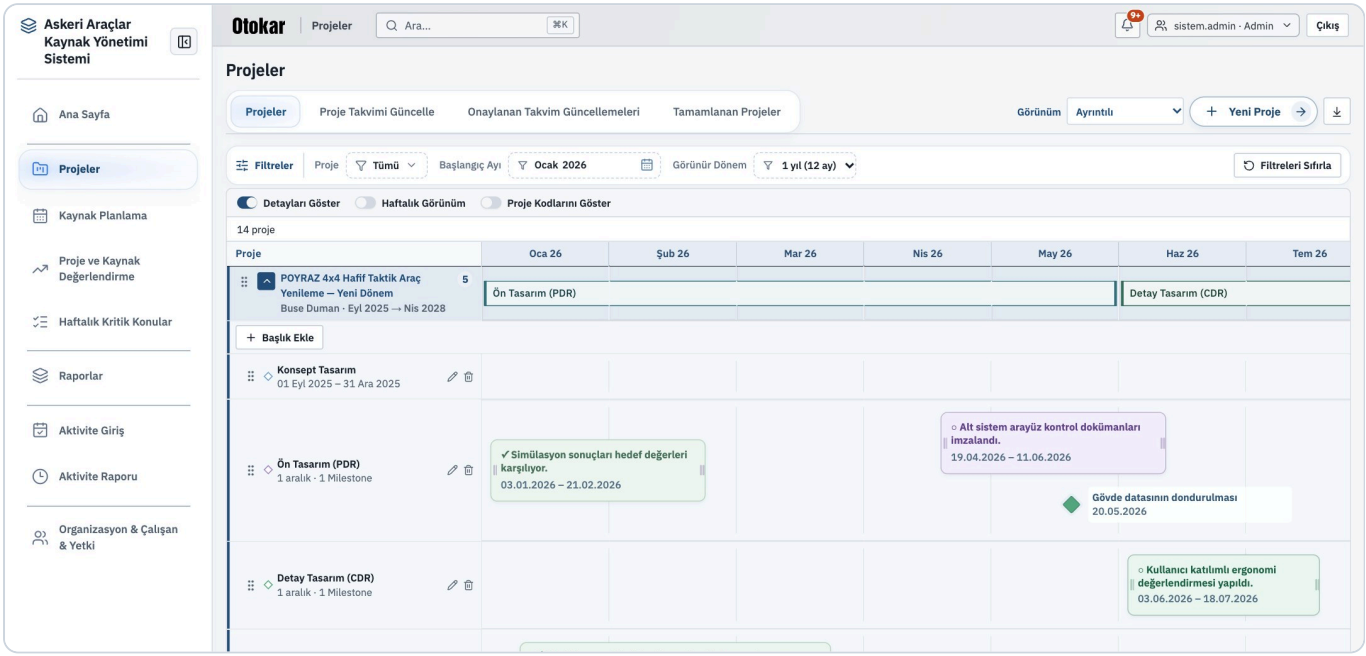

Detayları Göster açıkken aşamaların altında başlıklar, tarih aralıklı notlar ve kilometre taşları (baklava) görünür.

Görünüm ve araçlar


- **Görünüm**: Ayrıntılı, Kompakt veya 5 Yıllık Genel Bakış. **Görünür Dönem** 6 aydan 5 yıla kadar seçilir.
- **Haftalık Görünüm** aylık aşamaları haftalara yansıtır. **Proje Kodlarını Göster** açıksa Excel çıktısına kod sütunu eklenir.
- İndirme (↓) düğmesi proje raporunu Excel olarak indirir.
- **İlerleme çubuğu** (Admin ve Yönetici): Proje adının altında son kilitli ayın gerçekleşen yüzdesi dolgu, hedef yüzdesi siyah çizgi olarak görünür; renk sapma durumunu gösterir (mavi ileride, yeşil planda, turuncu geride, kırmızı kritik). Değerlendirmesi olmayan projede çubuk çıkmaz.

Proje ekleme ve düzenleme

1. **Yeni Proje** ile proje adı, kodu, sorumlusu, başlangıç ve bitiş ayını girin; gerekirse **Görüntüleme yetkisi**ni belirleyin. **Kaydet**.
2. Var olan projeyi düzenlemek için proje adına tıklayın. Projeler soldaki tutamaçla sürüklenerek veya `Alt` +ok tuşlarıyla sıralanır.
3. Aşama için ay kutusuna çift tıklayın; metin ve renk seçin. Komşu aylar seçilip sağ tık menüsüyle aşama kopyalanabilir.
4. **Detayları Göster** açıkken başlık, tarih aralıklı not veya tek tarihli kilometre taşı ekleyin. **Kritik Konulara Ekle** ile not Haftalık Kritik Konular'a taşınır. Barı veya baklavayı sürükleyerek tarihi değiştirebilirsiniz.

> **Projeyi Sil**, projenin planlanan ve gerçekleşen dağılımlarını, aşamalarını, değerlendirme kayıtlarını ve bağlı konularını da kaldırır.

Proje görüntüleme yetkisi

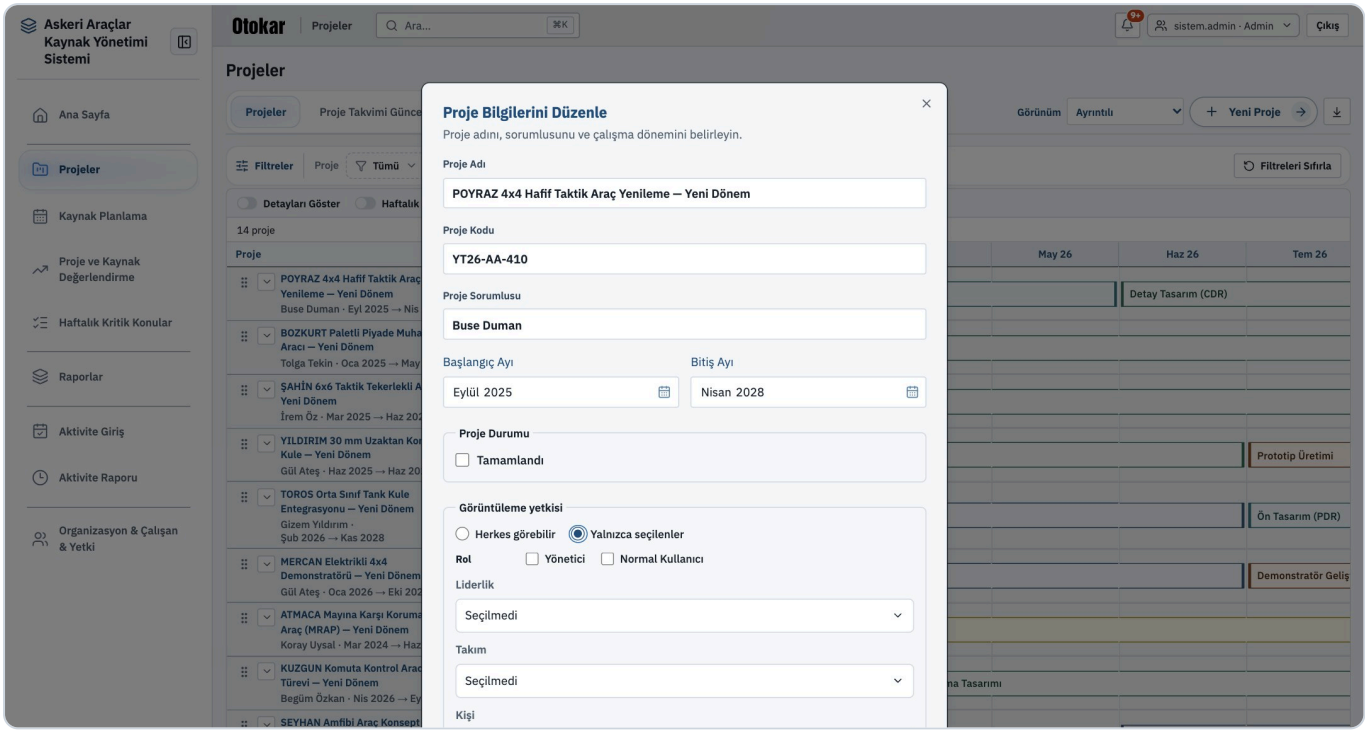


Proje bilgileri penceresi: "Yalnızca seçilenler" ile rol, liderlik, takım ve kişi kuralları tanımlanır.

Kurallar

- **Herkes görebilir** varsayılandır.
- **Yalnızca seçilenler** seçilip hiçbir seçim yapılmazsa proje yine herkese açık kalır.
- Kurallar **"veya"** ile birleşir: seçilen rol, liderlik, takım veya kişiden herhangi birine uyan kullanıcı projeyi görür.
- Liderlik kuralı alt liderlik ve takımları da kapsar.

Otomatik görünürlük


- Admin ve Normal-Proje her projeyi görür.
- Projede planlanan kaynağı olan takımlar ve gerçekleşen girişi olan kişiler projeyi kurala bakılmaksızın görür.
- Gizli projelerin kaynakları toplamlarda korunur; yalnız adı ve satırları gösterilmez.

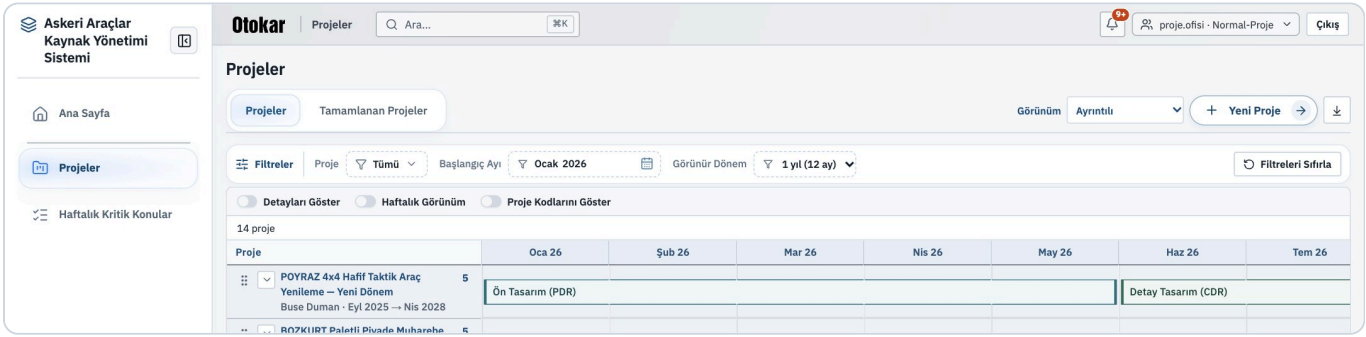

Normal-Proje rolü: menüde Ana Sayfa, Projeler ve Haftalık Kritik Konular; **Yeni Proje** açıktır.


Başlık, tarih aralıkları ve kilometre taşları

Başlığı düzenlediğinizde sağdan bir panel açılır. **Başlık ve Detaylar** sekmesinde başlık, tarih aralıkları ve açıklamalar birlikte düzenlenir. Her detay açıklamasının kendi başlangıç/bitiş tarihi vardır; tek günlü hedef için Milestone seçilir.

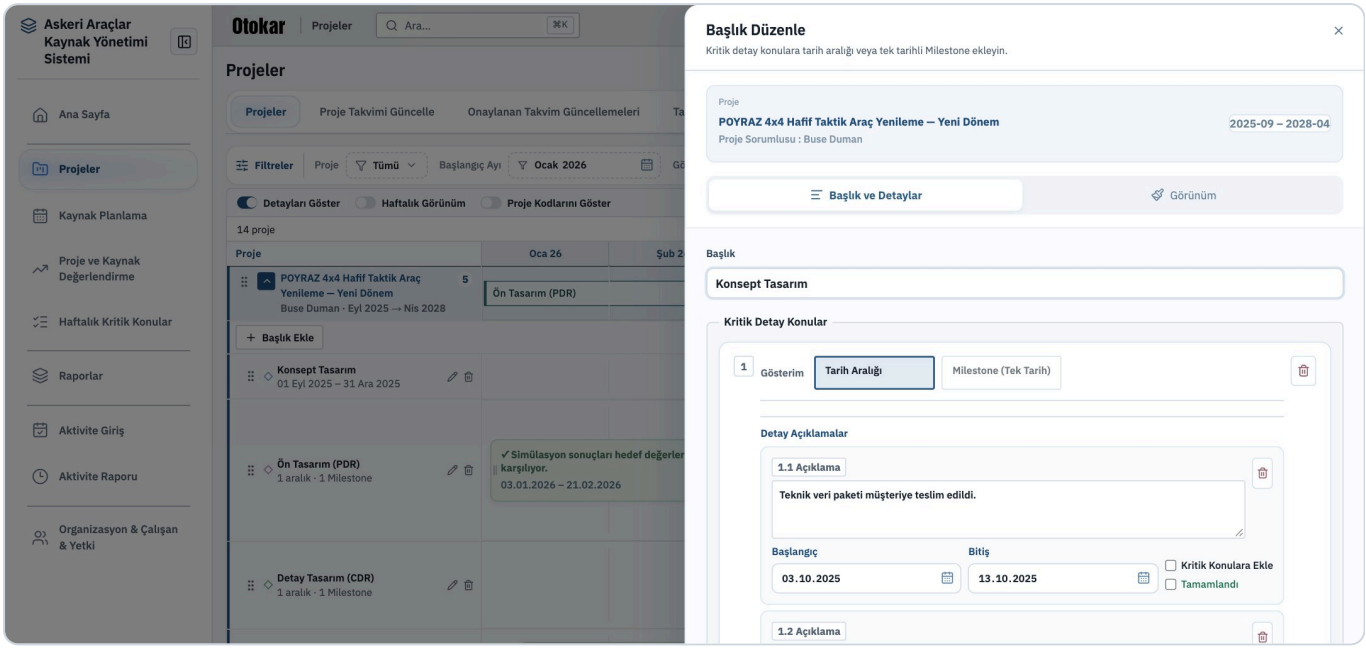

Tarih ve açıklamalar tek içerik sekmesinde yönetilir. Bir başlıkta birden fazla detay bulunabilir.


Görünüm, bar rengini ve görünüm biçimini değiştirir; tarihleri değiştirmez. Milestone görünümü, ilgili tek tarihli kaydın seçeneklerinden seçilir. Değişiklikleri Kaydet ile tamamlayın.

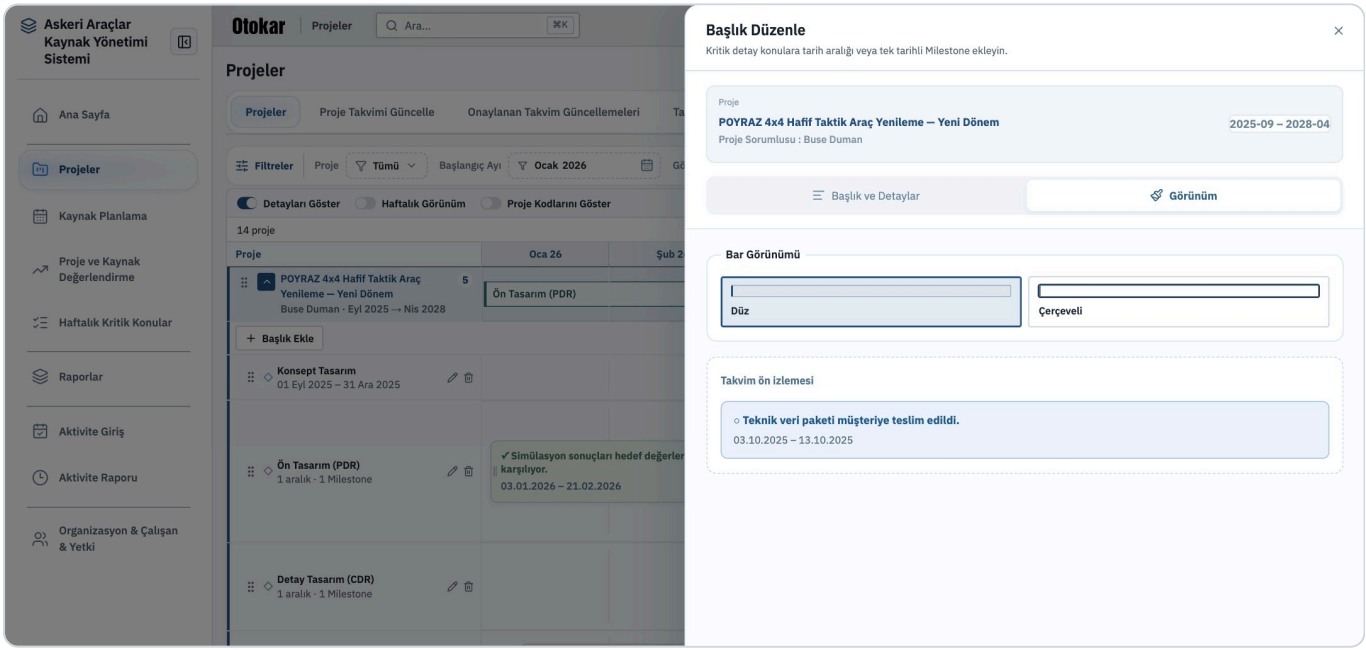

Barın görsel seçenekleri içerik düzenlemesinden ayrı sunulur.

Tamamlanan Projeler


Tamamlanan Projeler, Onaylanan Takvim Güncellemeleri'nin sağındadır. Projeler ile aynı takvim görünümünü kullanır; yalnız tamamlanan kayıtları gösterir. Proje görüntüleme kuralları burada da geçerlidir.

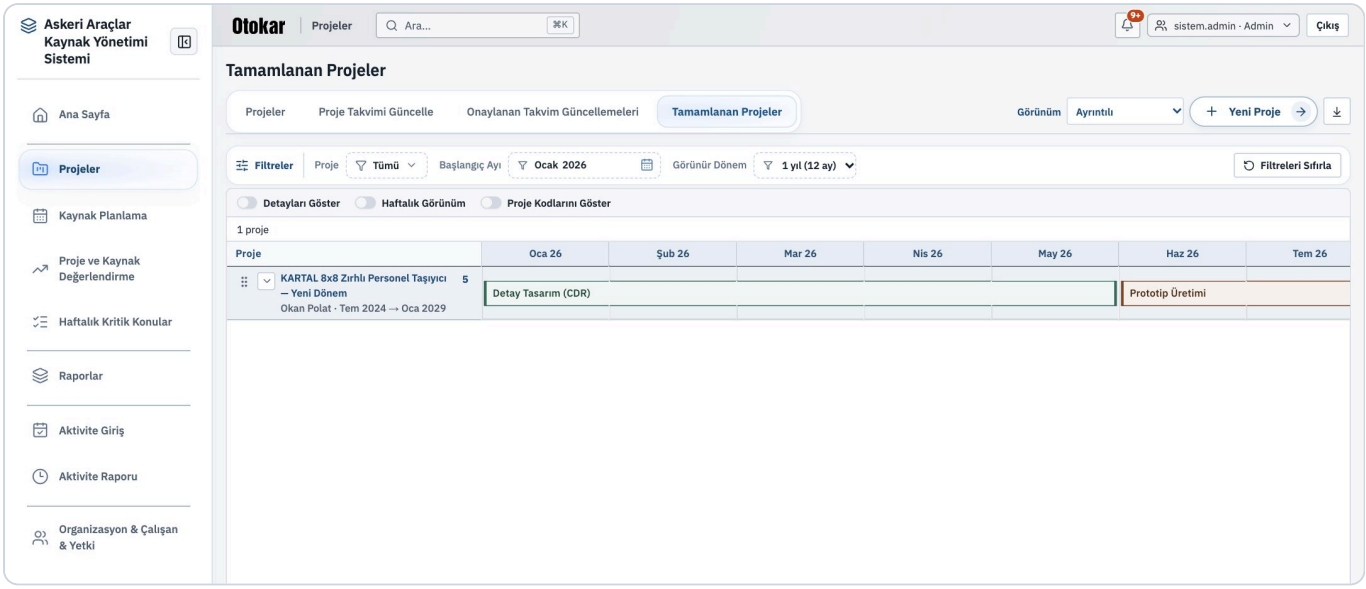

Tamamlanan proje aktif Projeler listesinden çıkar; geçmişi korunur.

Projenin durumunu değiştirme


1. Admin veya Normal-Proje hesabıyla proje adına tıklayıp **Proje Bilgilerini Düzenle** penceresini açın.
2. **Proje Durumu → Tamamlandı** seçimini işaretleyip Kaydet'e basın. Tekrar aktif yapmak için tamamlanan proje sekmesinde aynı seçimi kaldırın.
3. Bu işlem projeyi ve dağılımlarını silmez. Kaynak Planlama'da tamamlanan projeler başlangıçta gizlidir; istenirse gösterilebilir.

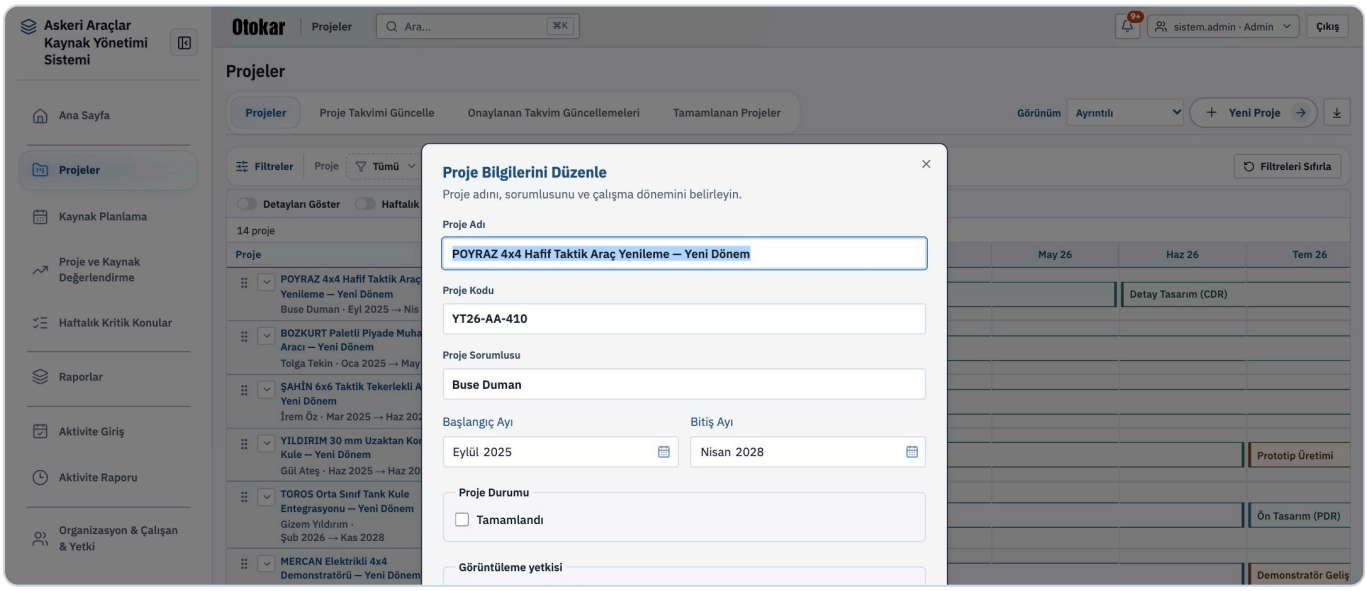

Proje Durumu, Görüntüleme yetkisi gibi ayrı bir çerçevede gösterilir.

5. Proje Takvimi Güncelle


Admin ve Yönetici, bir veya birkaç projenin ertelenmesi ya da öne çekilmesinin kaynak planına etkisini karşılaştırır. Senaryo hazırlamak gerçek takvimi değiştirmez.

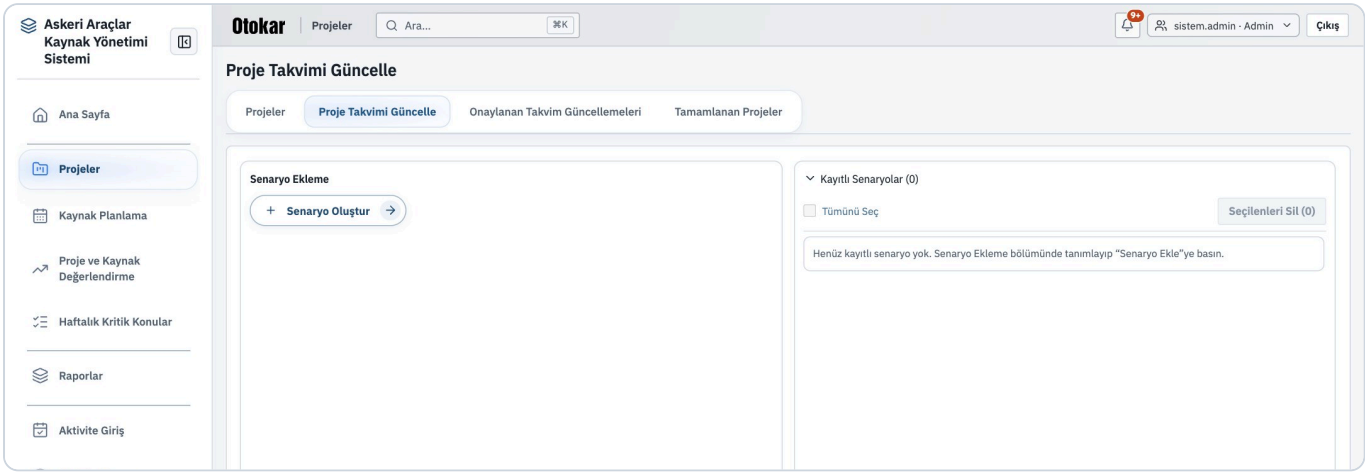

İlk açılışta kart kapalıdır. Senaryo Oluştur ile yeni taslak açılır.

Senaryo oluşturma


1. **Senaryo Oluştur** düğmesine basın. **Senaryo İsmi** yazın; **Başlangıç Ayı**, **Süre (Ay)** ve **Proje** seçin. Artı değer erteleme, eksi değer öne çekmedir.
2. **+ Proje Ekle** ile aynı senaryoya başka proje ekleyin. **Aşamalar, başlıklar ve kilometre taşları da kaysın** seçimini kontrol edin. Önceki aylar ve gerçekleşen girişler korunur.
3. **Senaryo Ekle** ile kaydedin. Kart kapanır ve Senaryo Oluştur yeniden görünür. Yalnız proje seçmek karşılaştırmaya eklemez; bunun için Senaryo Ekle gerekir.

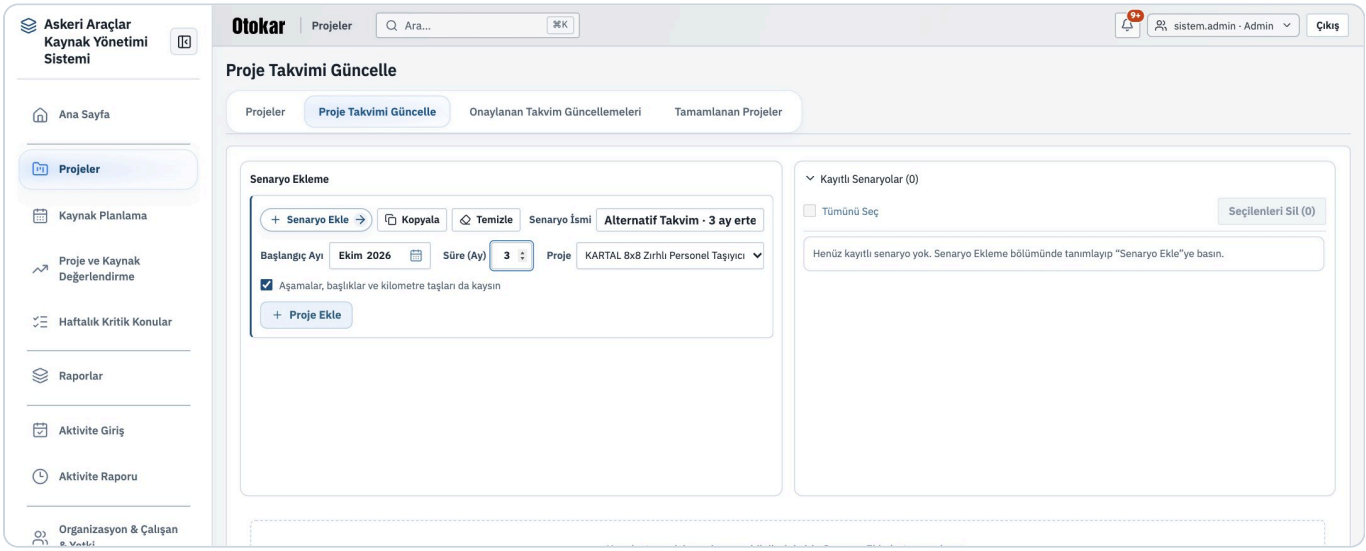

Solda senaryo girişi, sağda sabit yükseklikte kayıtlı senaryolar listesi.

Kopyala karttaki bilgilerle alternatif hazırlar; **Temizle** kartın seçimlerini boşaltır. En fazla üç senaryo karşılaştırılır; proje bitişi ve liderlik/takım kalan kaynağı birlikte gösterilir.


Kayıtlı senaryoları düzenleme ve silme

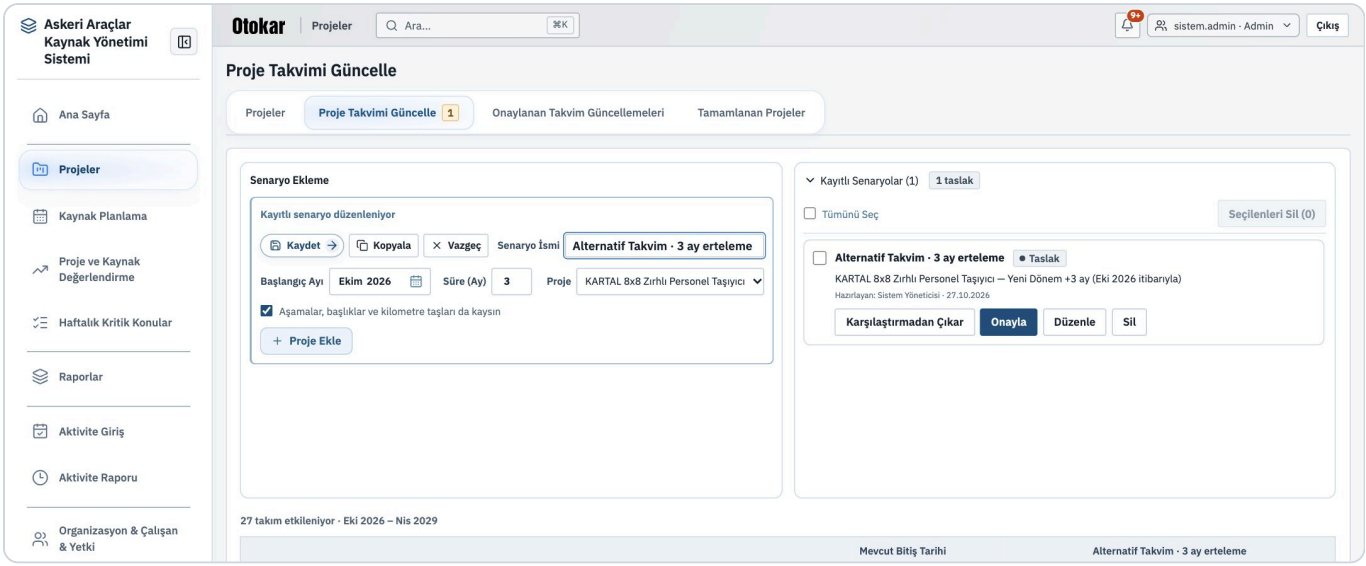

Düzenle ile kart yeniden açılır; Senaryo İsmi dahil değişiklikler Kaydet ile aynı senaryoya yazılır.

- Yeni kayıt en üst satıra eklenir. Liste uzadığında kendi içinde kaydırılır. Admin tüm taslakları, Yönetici kendi taslağını düzenleyebilir.
- Silinebilir satırları işaretleyip **Seçilenleri Sil** ile topluca silin. Yönetici kendi taslak/kapatılmış kayıtlarını; Admin takvime aktarılmamış uygun kayıtları silebilir.
- **Raporlarda Göster** karşılaştırmayı Raporlar ekranına taşır. Buradaki **Kaldır** yalnız rapor karşılaştırmasını kaldırır; kayıtlı senaryoyu silmez. İndirme düğmesi Excel çıktısı verir.

Onaylanan Takvim Güncellemeleri

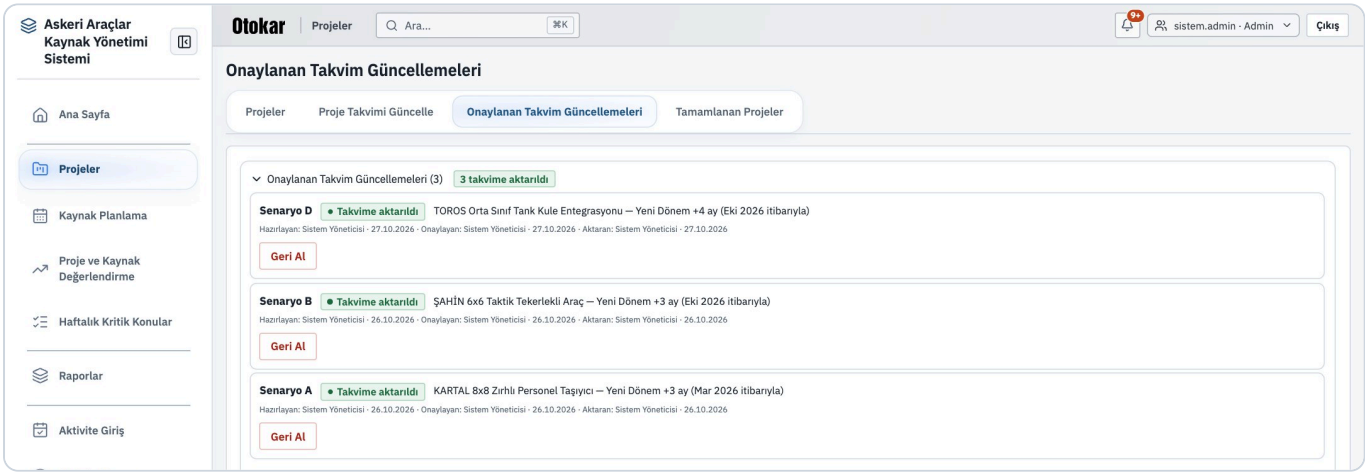


Onaylanan ve takvime aktarılan kayıtlar ayrı sekmede izlenir.

Admin: **Onayla** kararı kaydeder. **Takvime Aktar**, onay ve etki kontrolünden sonra planlanan dağılımı ve seçildiyse aşama/başlık/kilometre taşlarını taşır. **Geri Al** işleminden sonra başka değişiklik olmuşsa geri alma reddedilir. Takvime aktarılmış kayıt doğrudan silinemez. Yönetici onaylayamaz veya gerçek takvime aktaramaz.

6. Kaynak Planlama

Admin ve Yönetici içindir. Değerler kişi bazında değil, takım veya liderlik kaynağı için **kişi eşdeğeri** olarak girilir (0,5 = yarım kaynak).

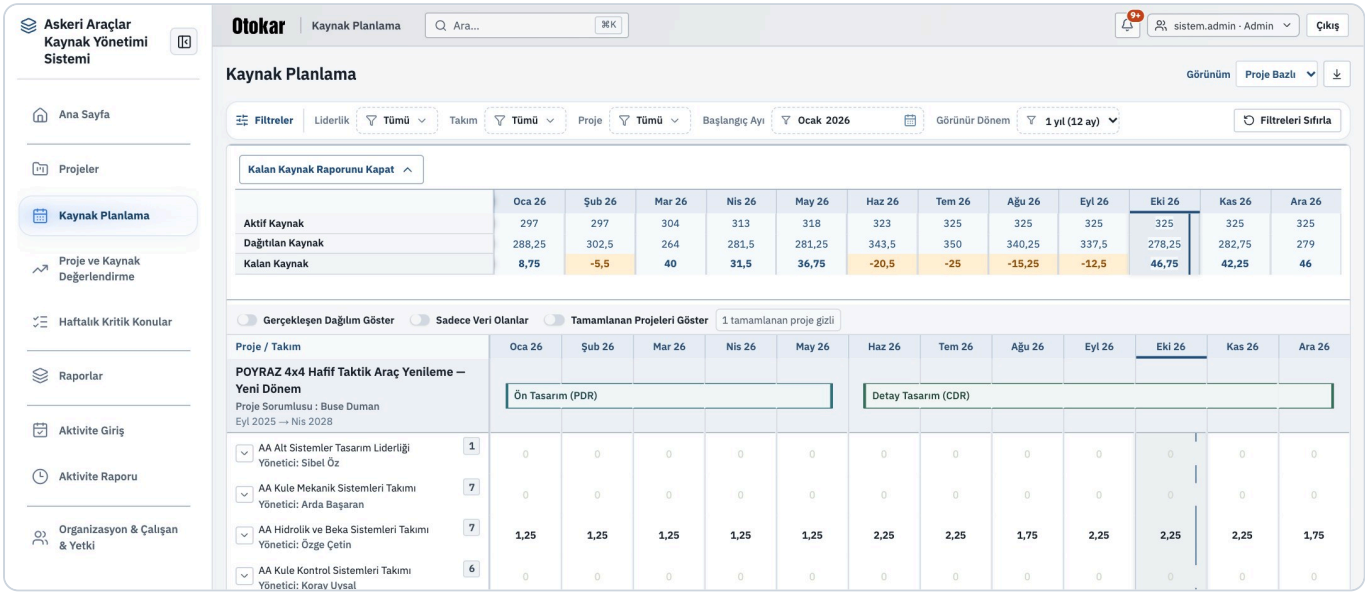

Üstte Kalan Kaynak Raporu (Aktif / Dağıtılan / Kalan Kaynak); altta proje bazında takım dağılımı.

Kaynak planlama

1. **Görünüm** olarak **Proje Bazlı** veya **Takım Bazlı** seçin; filtreleri belirleyin.
2. Yetkili olduğunuz ay hücresine değeri yazıp `Enter`'a basın. Yetkisiz veya proje dönemi dışındaki hücreler kilitlidir.
3. **Kalan Kaynak** negatifse kaynak açığıdır ve renkli gösterilir. Rapor **Kalan Kaynak Raporunu Kapat** ile gizlenir.

Hızlı giriş

İşlem	Yöntem
Birden fazla hücre seçmek	Fareyi basılı tutup sürükleyin; `Ctrl` ile tıklayarak seçime hücre ekleyin veya çıkarın.
Seçimi tek hücreye indirmek	Seçili hücrelerden birine (Ctrl'siz) tıklayın; seçim yalnız o hücre olur.
Seçime aynı değeri yazmak	Değeri yazıp `Ctrl` + `Enter`.
Kopyala / yapıştır	`Ctrl` + `C` / `Ctrl` + `V` veya sağ tık menüsü; takım/ay düzeni korunur.
Seçimi kaldırmak	`Esc` veya tablo dışına tıklama.

Tamamlanan Projeleri Göster, filtre satırında **Sadece Veri Olanlar** yanında bulunur ve ilk açılışta kapalıdır. Açıldığında tamamlanan projelerin kayıtları da gösterilir; bu seçim mevcut dağılımları değiştirmez.


Gerçekleşen Dağılım Göster plan değerlerinin yanında gerçekleşenleri de gösterir; **Sadece Veri Olanlar** boş satırları gizler.

Tabloda kaydedilmemiş, kaydı süren veya hata almış bir hücre varsa **Sadece Veri Olanlar** ve **Tamamlanan Projeleri Göster** görünümü değiştirmez; *"Değişiklikleri kaydedin veya Escape ile iptal edin..."* uyarısı çıkar. Girdiğiniz değer ve hata mesajı yerinde kalır. Kaydedin veya `Esc` ile taslağı iptal edip seçimi yeniden yapın.

> Tüm planı temizleyen **Tüm Kaynak Dağılımlarını Sıfırla** bu ekranda değil, yalnız Admin'in açabildiği Organizasyon & Çalışan & Yetki ekranındadır (12. bölüm).

7. Proje ve Kaynak Değerlendirme

Admin ve Yönetici içindir. Liderlikler, projedeki işlerinin hedef ve gerçekleşen tamamlanma yüzdelerini girer. Sistem ilerlemeyi kaynak planıyla birlikte değerlendirir.

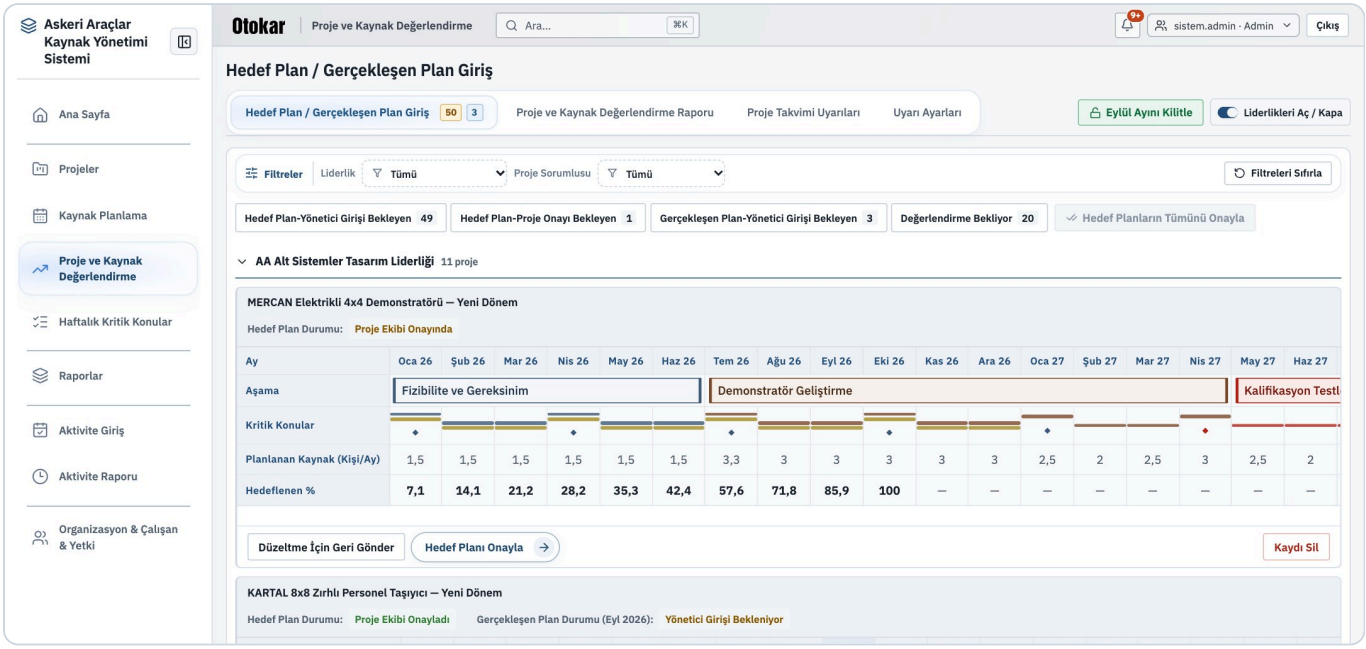

Giriş sekmesinin yanında turuncu hedef plan ve mavi gerçekleşen giriş sayısı; altında Liderlik, Proje Sorumlusu ve bekleyen iş seçimleri.

Sekmedeki bekleyen adetleri


Giriş sekmesindeki **turuncu sayı (Hedef Plan Bekleyen)**, Yönetici girişi ve proje onayı bekleyen planların toplamıdır; iki alt sayı üzerine gelindiğinde açıklamada görünür. **Mavi sayı (Gerçekleşen Giriş Bekleyen):** Seçili ayın henüz girilmemiş gerçekleşen kayıtlarıdır. Sayılar kullanıcının yetkili olduğu birimler ve seçili Liderlik/Proje Sorumlusu kapsamında hesaplanır; Admin tüm yetkili kapsamı, Yönetici kendi kapsamını görür.

Tek seçimli bekleyen iş filtreleri

Seçim	Gösterilen kayıtlar
Hedef Plan-Yönetici Girişi Bekleyen	Henüz girilmemiş veya taslak hedef planlar.
Hedef Plan-Proje Onayı Bekleyen	Proje ekibinin onayını bekleyen hedef planlar.
Gerçekleşen Plan-Yönetici Girişi Bekleyen	Seçili ay için yönetici gerçekleşen girişi beklenen kayıtlar.
Değerlendirme Bekliyor	Gerçekleşeni girilmiş, ay kilidiyle değerlendirilmesi beklenen kayıtlar.

Aynı anda en fazla bir seçim etkindir. Etkin seçime yeniden basmak süzgeci kaldırır ve tüm yetkili kartları gösterir. Ayrı Tümü düğmesi ve üst satırdaki Hedef Plan / Gerçekleşen Plan açılır filtreleri bulunmaz.

Ay seçimi, hedef plan ve gerçekleşen girişi

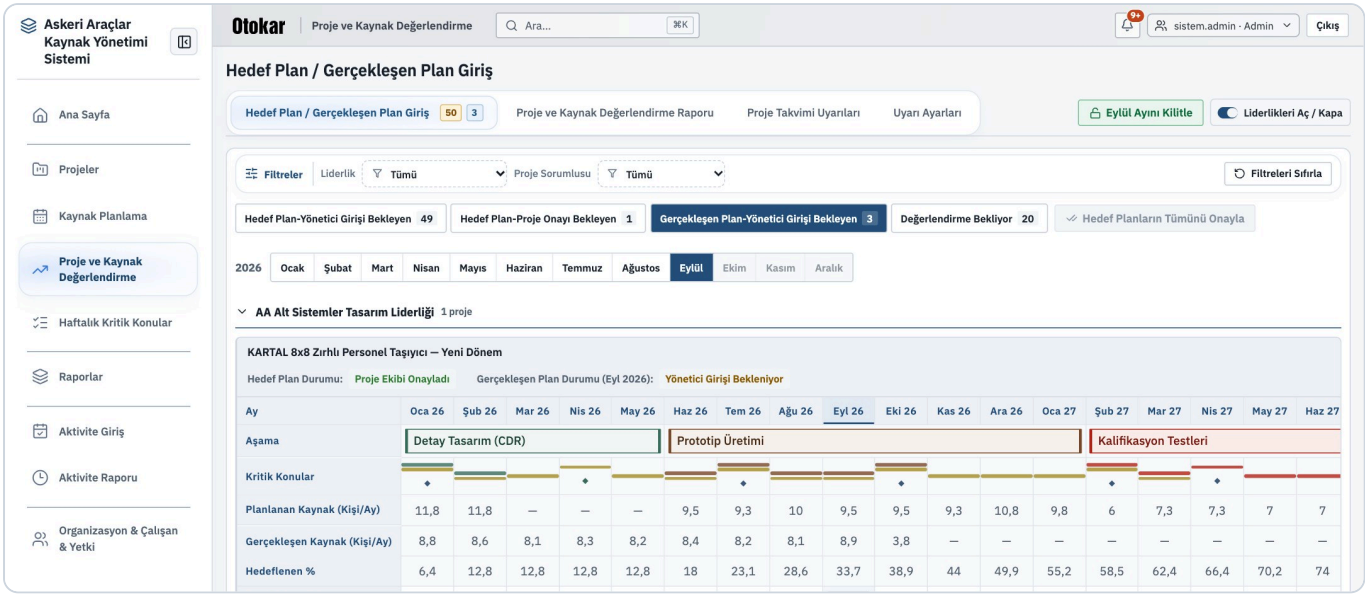

Ay satırı yalnız Gerçekleşen Plan-Yönetici Girişi Bekleyen veya Değerlendirme Bekliyor seçiminde açılır.

Değerlendirme Bekliyor seçildiğinde işlemdeki varsayılan ay seçilir: önceki ay; takip kapsamına girmiyorsa seçilebilir son ay. Yıl altındaki aylardan başka bir dönem seçebilirsiniz. İçinde bulunulan ay, gelecek aylar ve takip başlamamış dönemler seçilemez. Örneğin Ekim, 1 Kasım'da seçime açılır; değerlendirme raporunun mevcut ay görünümü korunur.


Ay satırında içinde bulunulan yıl ve önceki yıl açık görünür. Daha eski yıllar **Önceki yıllar (n)** düğmesiyle açılıp kapanır; seçili ay eski bir yıldaysa o yıl görünür kalır. Tamamlanan projelerin kayıtları ay satırını geriye doğru genişletmez.

1. Hedef plan kartında başlangıç yüzdesini ve aylık hedefleri hazırlayın, taslağı kaydedip proje ekibi onayına gönderin. Sıra: Yönetici Girişi Bekleniyor → Taslak → Proje Ekibi Onayında → Proje Ekibi Onayladı.
2. Onaylı planda, o aya kadar tamamlanan toplam payı (%) ve açıklamayı girin. %45, ay sonuna kadar işin %45'inin tamamlandığını gösterir.
3. **Hedef Plan Revize Et** ile gerekçeli yeni hedef plan hazırlayın; revizyon onaylanana kadar önceki plan geçerlidir. Kayıtlı gerçekleşen değer, ay kilitlenene kadar **Gerçekleşen % Revize Et** ile düzeltilebilir.
4. Admin, Hedef Plan-Proje Onayı Bekleyen seçimini açıp **Hedef Planların Tümünü Onayla** ile görünür bekleyen planları onaylar. **Liderlikleri Aç / Kapa** kart gruplarını yönetir.

> **Önerileni Uygula:** Bir ayın yüzdesi değişirse o ay sabit tutularak önceki ve sonraki düzenlenebilir aylar kaynak ağırlıklarıyla yeniden hesaplanır. Kilitli aylar korunur. Sonuçları kontrol edip kaydedin.

> **Ay kilidi (Admin):** [Ay] Ayını Kilitle, seçili ayı değişikliğe kapatır ve değerlendirmeyi oluşturur. Kilit açılırsa değerlendirme kaldırılır; girişler yeniden açılır. Yönetici ay kilidini açamaz.

Proje ve Kaynak Değerlendirme Raporu

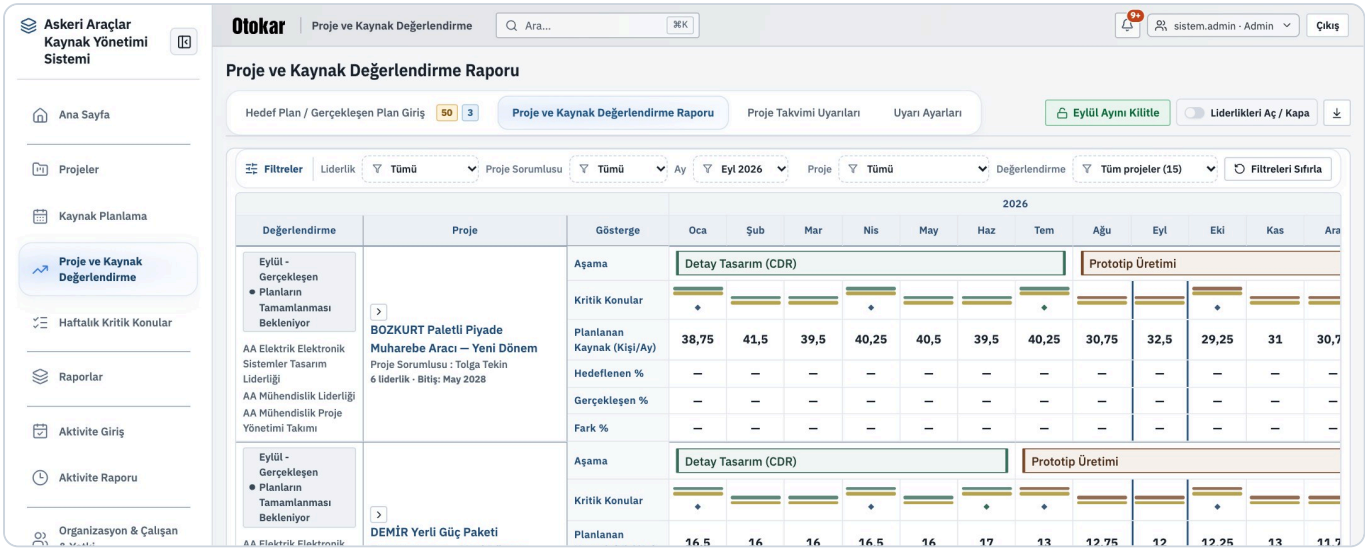


Her proje için aşama, kritik konular, planlanan kaynak, hedeflenen %, gerçekleşen % ve fark %.

- Filtreler: **Liderlik**, **Proje Sorumlusu**, **Ay**, **Proje** ve **Değerlendirme**. Değerlendirme listesi projeleri karar durumuna göre süzer (Dikkat gerektiren konular, Planın İlerisinde, Planın Gerisinde / Kritik Gecikme, Değerlendirme bekliyor, Fazla kaynak değerlendirilebilir, Tamamlandı vb.); parantezdeki sayı o durumdaki proje sayısıdır.
- Tüm projeler tek tabloda listelenir; tablo aşağı kaydırıldıkça sonraki projeler yüklenir. **Liderlikleri Aç / Kapa** liderlik satırlarını açar. İndirme düğmesi raporu Excel'e aktarır.

Proje toplamı: Liderlik yüzdeleri planlanan kaynak paylarıyla ağırlıklandırılır; kaynak planı tamamen kaldırılmışsa onaylı plandaki kaynak referansı kullanılabilir. Özel ağırlık girmeniz gerekmez. Hedef/gerçekleşen bilgisi veya geçerli kaynak payı olmayan satırın sonucu boş görünebilir; bu durum sıfır ilerleme anlamına gelmez.

Proje Takvimi Uyarıları

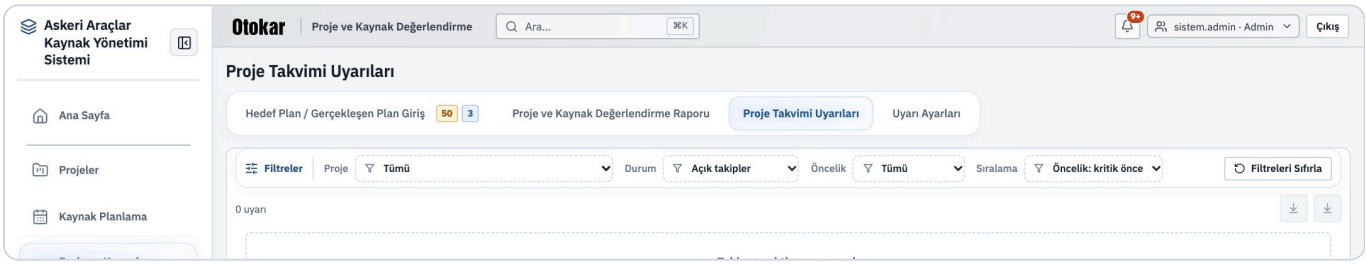

Kilitli aylarda oluşan uyarılar, durumları ve aksiyon açıklamaları.


Ay kilitlendiğinde her proje için ilerleme durumu (Planın İlerisinde, Planda, Planın Gerisinde, Kritik Gecikme) ile kaynak durumu (Planlanmamış, Yetersiz, Yeterli, Fazla) birleştirilir ve S-01…S-09 kurallarından uyan uyarı oluşur (örneğin S-02: "Ek kaynak gerekli veya bitiş tarihi revize edilmeli"). Uyarının durumu **Açık → Görüldü → Aksiyon Alındı → Kapandı** olarak ilerler; her adımda aksiyon açıklaması zorunludur. **Hesap ve geçmiş** hesaplamayı ve aksiyon geçmişini gösterir. Liste Excel veya CSV olarak indirilir.

Uyarı Ayarları (Admin)

Planın İlerisinde / Gerisinde ve Kritik Gecikme sapma eşikleri (puan), kaynak planı kontrol dönemi (ay), yeterli kaynak karşılama aralığı (%) ve kritik gecikme için ardışık kilitli ay sayısı buradan belirlenir. **Ayarları Kaydet** sonrası uyarılar yeniden değerlendirilir; **Varsayılanları Getir** ilk değerlere döner. **Senaryo kural tablosu** kuralların tamamını gösterir.

Kaydedilmemiş değerlendirme taslağı

Hedef plan veya gerçekleşen alanını değiştirdiğinizde **Kaydedilmemiş değişiklikleriniz var** uyarısı görünür. Başka bir kullanıcı aynı kaydı değiştirse de açık taslağınız korunur.

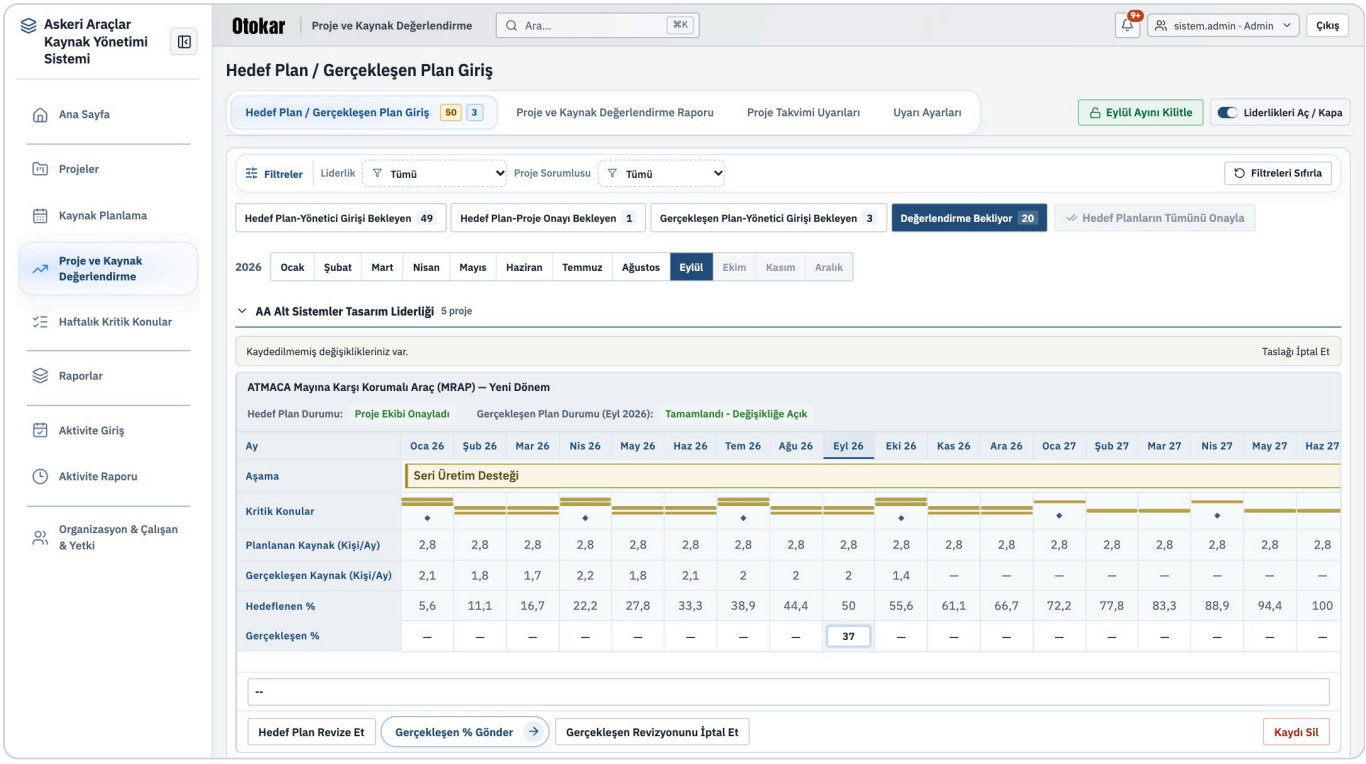


Taslak uyarısı ve Taslağı İptal Et düğmesi. Görseldeki değişiklik kaydedilmemiştir.

1. Kendi değişikliğinizi kaydetmek için karttaki ilgili kaydetme veya gönderme düğmesini kullanın.
2. Bu sırada kayıt uzaktan değişmişse kaydetme çakışma hatası verir. Girdiğiniz değerler korunur; sunucudaki yeni kaydın üzerine yazılmaz.
3. Gerekli değerleri not edin. **Taslağı İptal Et**, yerel değişikliği bırakıp güncel kayda dönmenizi sağlar; ardından güncel kayıtta yeniden düzenleyin.
4. Sekme değiştirme veya çıkış sırasında taslağı bırakma onayı çıkarsa, düzenlemeye dönmek için vazgeçin. Ay veya filtre değişiminde kaydedilmemiş giriş uyarısı çıkarsa önce kaydedin ya da taslağı açıkça iptal edin.

> Bir ay siz düzenlerken Admin tarafından kilitlenirse sunucu değişikliği reddeder. Taslağı iptal edip güncel durumu kontrol edin; gerekli düzeltme için Admin'den kilidi açmasını isteyin.

8. Haftalık Kritik Konular

Projelerde **Kritik Konulara Ekle** ile işaretlenen notlar proje ve başlık bazında hafta numaralarıyla listelenir. Admin ve Normal-Proje düzenler; Yönetici de görebildiği projelerin kritik başlık, konu ve tarihlerini düzenler. Bu yetki proje adını, genel takvimini veya erişim kurallarını değiştirmez.

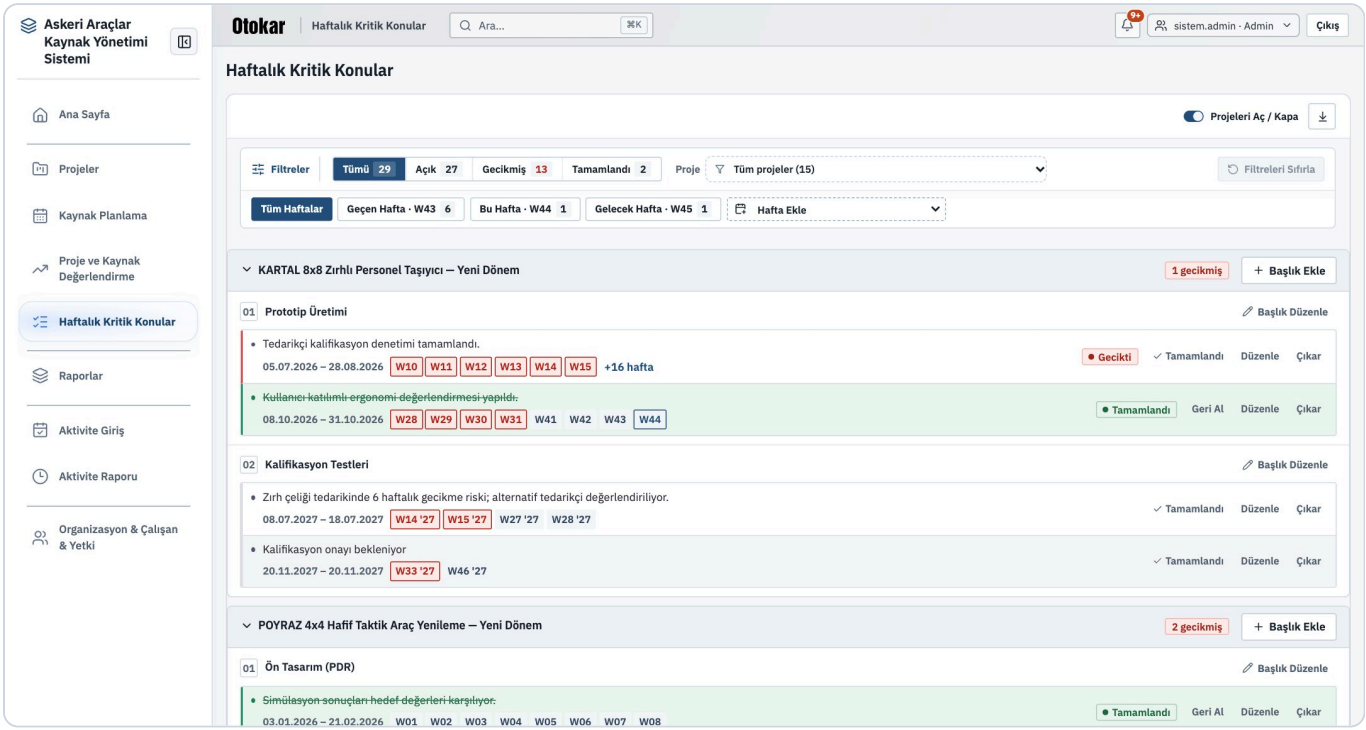

Durum seçimleri solda, proje filtresi sağdadır. Hafta kutuları mevcut ve önceki tarih aralıklarını birlikte gösterir.

- **Durum:** Tümü, Açık, Gecikmiş, Tamamlandı (yanında sayıları). **Hafta:** Tüm Haftalar, Geçen Hafta, Bu Hafta, Gelecek Hafta; **Hafta Ekle** ile başka haftalar seçilir. Konunun kapsadığı haftalar W-numaralarıyla yazılır; 8'den fazla hafta kutusu varsa ilk altısı ve bu hafta görünür, kalanlar **+N hafta** düğmesinde toplanır (tıklayınca hepsi açılır).
- **Başlık Ekle** ve **Başlık Düzenle** başlıkları; konu satırındaki **Düzenle** notu değiştirir. Değişiklikler Projeler ekranına da yansır.
- **Tamamlandı** notu tamamlandı olarak işaretler (**Geri Al** ile kaldırılır); **Çıkar** notu yalnız bu listeden çıkarır, silmez.
- **Hafta kutuları:** Mevcut tarih aralığındaki geçmiş haftalar gecikme durumunu kırmızı gösterir. Önceki revizyonlardan kalan haftalar düz kırmızı çerçeveyle ayrılır. Hangi tarih aralığından geldiğini görmek için kutunun üzerine gelin.
- **Projeleri Aç / Kapa** proje gruplarını açar veya kapatır.


Excel çıktısı

İndirme düğmesi her konuyu ayrı satır olarak indirir: Proje ve Başlık (aynı proje ve aynı başlığın satırları birleşik), Detay Açıklama, Başlangıç, Hedef Bitiş ve Durum. Sağda **5 hafta sütunu** vardır: geçen hafta, bu hafta ve sonraki üç hafta.

İşaret	Anlamı
X	Hedef hafta (konunun bitiş tarihinin haftası).
NOK	Hedef haftada tamamlanmadı (kırmızı, üstü çizili). Tamamlanana kadar her geçen hafta NOK olur ve X bu haftaya kayar.
OK	Konu tamamlandı; hedef haftasında yeşil gösterilir.

9. Raporlar ve Head Count

Admin ve Yönetici içindir. **Kaynak Raporları** ve **Head Count** alt sekmeleri vardır.

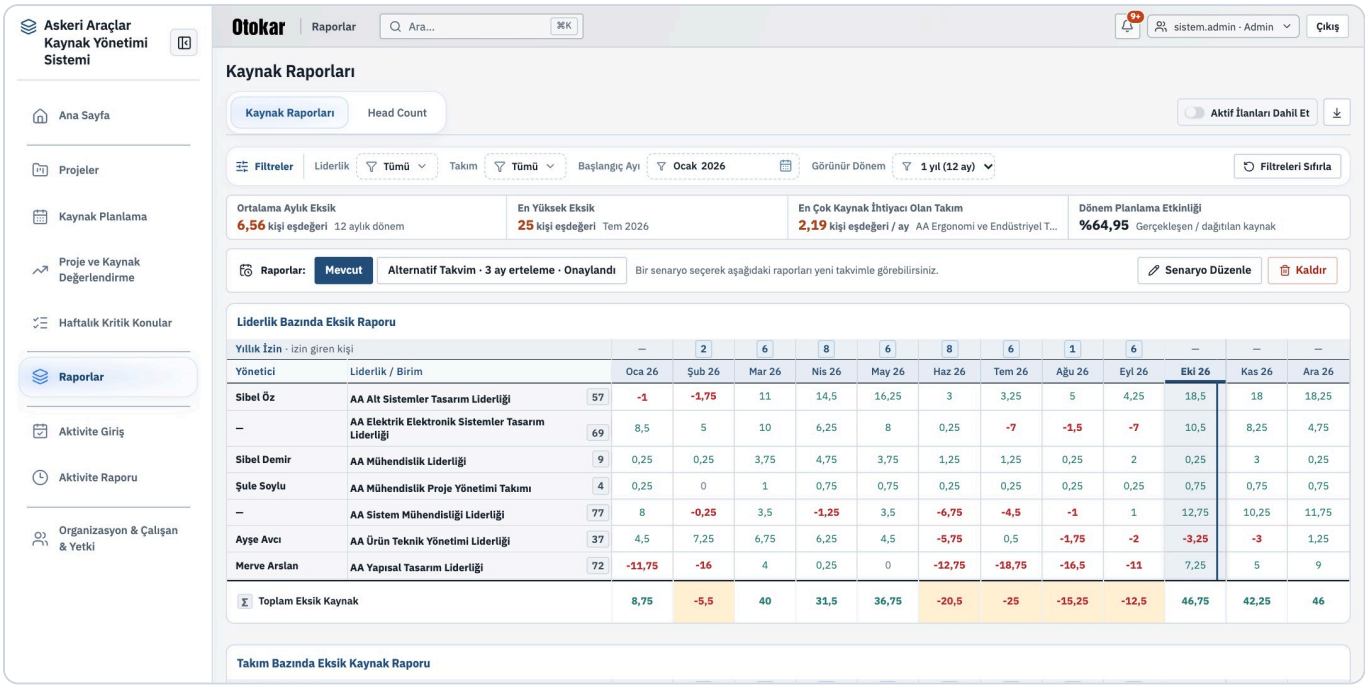


Özet kartlar, Liderlik Bazında Eksik Raporu ve Takım Bazında Eksik Kaynak Raporu.

Rapor / alan	Nasıl okunur?
Özet kartlar	Ortalama aylık eksik, en yüksek eksik, en çok kaynak ihtiyacı olan takım ve dönem planlama etkinliği (gerçekleşen / dağıtılan kaynak).
Liderlik / Takım Bazında Eksik	Birimlerin aylık kalan kaynağı; negatif değer açıktır. **Yıllık İzin** satırı ay ay izin giren kişi sayısını gösterir. Alt liderlikler üst toplamın kırılımıdır, tekrar toplanmaz.
Grafikler	Aylık eksik kaynak, planlanan / gerçekleşen karşılaştırması, süreç etkinliği ve çalışan sayısı öngörüsü. Grafik üzerinde gezinince ay değerleri görünür.
Senaryo seçimi	Proje Takvimi Güncelle'den **Raporlarda Göster** ile gelinince raporlar seçilen senaryoya göre çizilir; değişen hücreler çerçevelidir. Kayıtlar değişmez.

> **Aktif İlanları Dahil Et** varsayılan olarak **kapalıdır** ve yalnız Admin değiştirebilir. Açıldığında tüm aktif ilanlar bugünkü tarihle kaynak planlamasına dahil edilir; bu işlem kayıtları değiştirir, yalnız görünümü değil.

Head Count

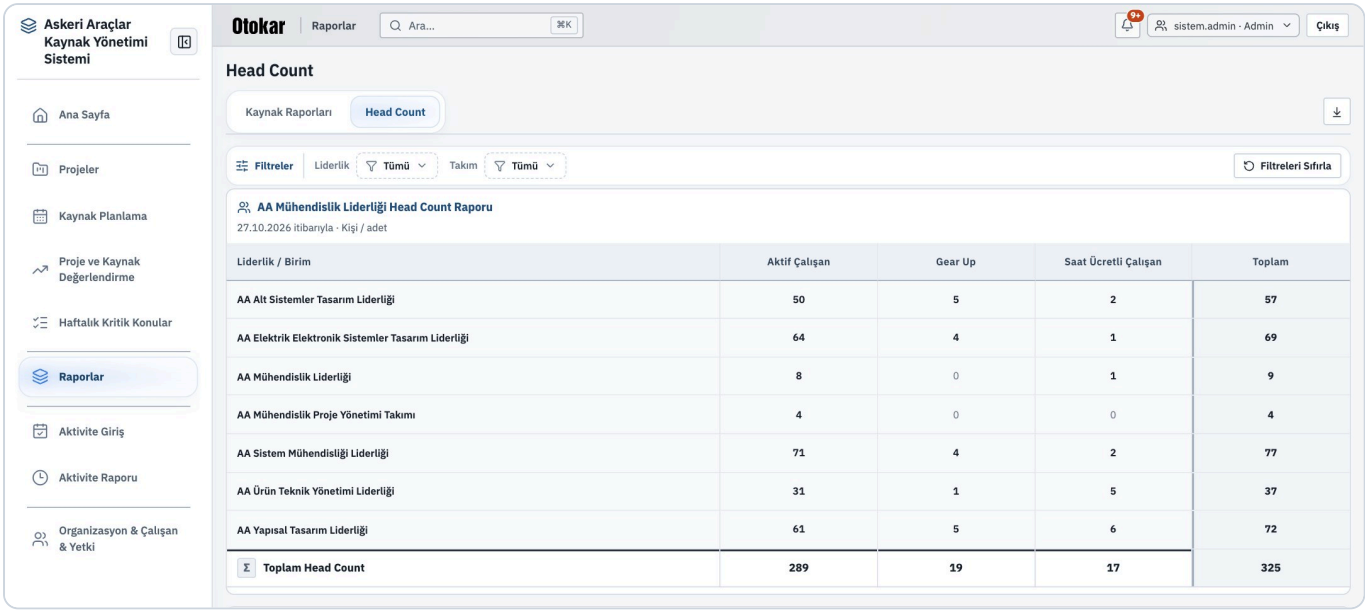


AA Mühendislik Liderliği Head Count Raporu.

- **AA Mühendislik Liderliği Head Count Raporu:** Aktif Çalışan + Gear Up + Saat Ücretli Çalışan.
- **İnsan Kültür Dönüşüm Verilerine Göre Head Count:** Aktif Çalışan, Aktif İlan ve Pasif İlan ayrı gösterilir; **Aktif İlan Dahil Head Count** = Aktif Çalışan + Aktif İlan.
- Bugünkü durumu kişi/adet olarak sayar; plana dahil seçimine bağlı değildir. İndirme düğmesi Excel çıktısı verir.

10. Aktivite Giriş ve takvimler

Çalışanların projelere fiilen ayırdığı süre aylık olarak burada girilir. **Görünüm**: **Proje Bazlı** (proje altında kişiler) veya **Kişi Bazlı** (kişi altında projeler). **Kaynak Dağılım Birimi**: Yüzde (%) veya Saat.

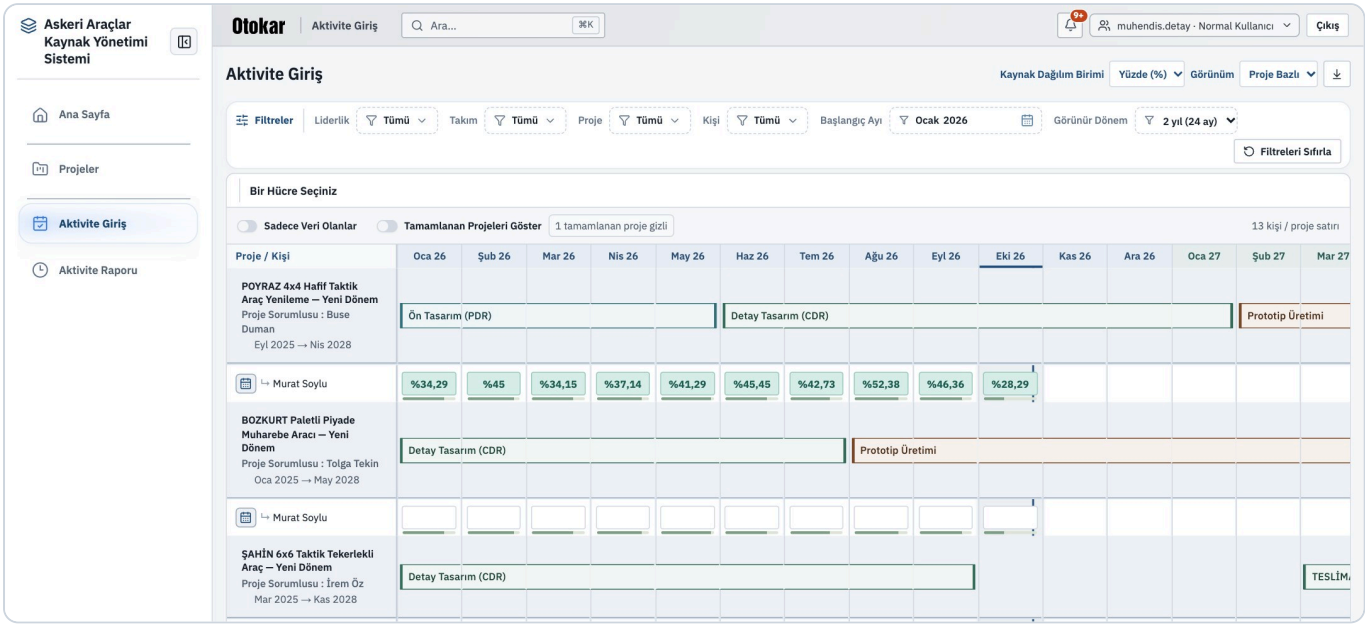

Team Member görünümü: yalnız kendi satırı görünür. Hücre altındaki çubuk kişinin o ay tüm projelerdeki toplamını gösterir.

Kimlerin listelendiği çalışan kaydındaki göreve bağlıdır: Team Member yalnız kendini, Product Owner takımını, Lider liderliğindeki ve alt liderliklerdeki herkesi görür ve düzenler (2. bölüm).

Aylık süre girme

1. Filtrelerden kişi, proje ve dönemi seçin; birimi belirleyin.
2. Ay hücresine değeri yazıp `Enter`'a basın veya hücreden çıkın. Hücre seçilince üstte çalışan, ay, çalışma saati ve **Kalan** bilgisi görünür.


> Giriş yalnız içinde bulunulan ay ve geçmiş aylar için, proje dönemi içinde yapılabilir. Proje süreleri ile eğitim toplamı kişinin net aylık kapasitesini aşamaz.

Ortak çalışma takvimi (Admin)

Araç satırındaki **Çalışma Takvimi** resmî tatilleri gösterir; resmî ve dini bayramlar sistemde tanımlıdır. Kuruma özel çalışma dışı günler **Elle Girilmiş Tarihler** bölümünde eklenir veya silinir; değişiklikler **Takvimi Kaydet** ile kalıcı olur.

Tamamlanan projelerin aktivite girişleri


Tamamlanan Projeleri Göster, Aktivite Giriş'te **Sadece Veri Olanlar** yanındadır ve ilk açılışta kapalıdır. Kaynak Planlama'daki seçimden bağımsız çalışır.

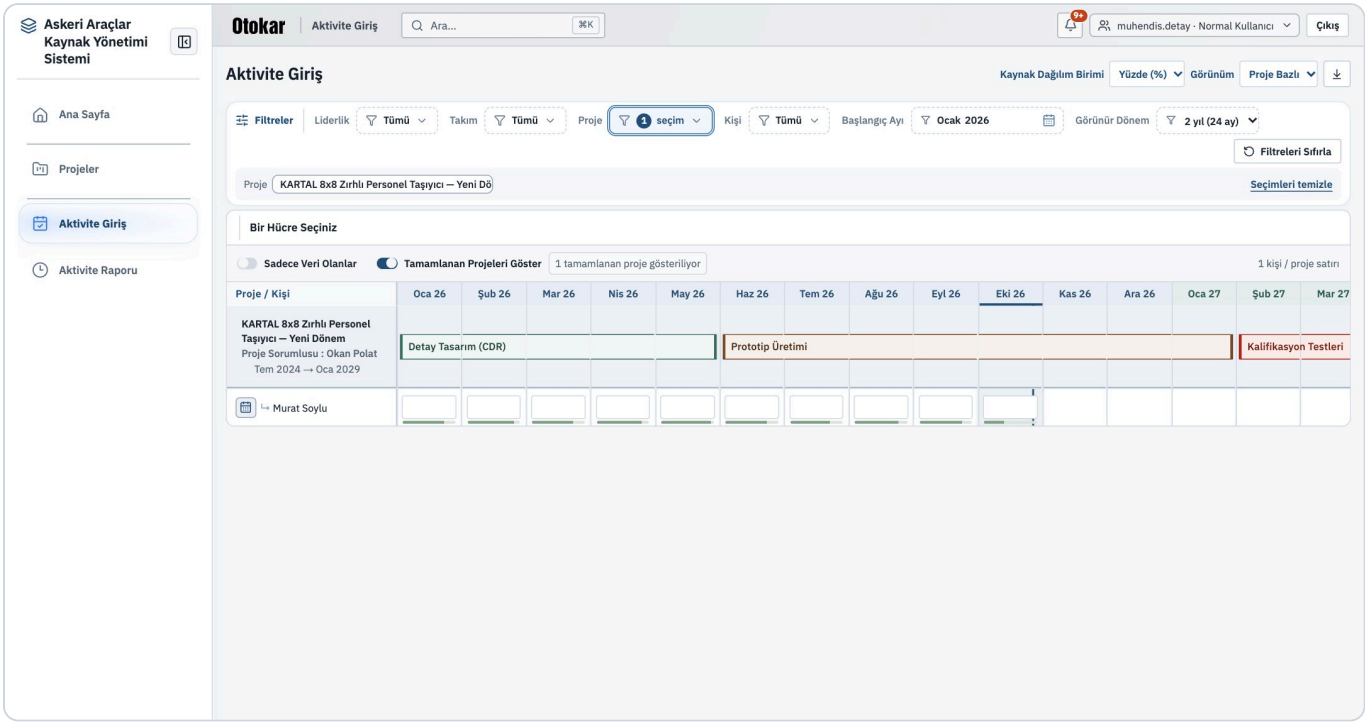

Örnek: seçim açıkken yalnız tamamlanan bir proje filtrelenmiş. Kullanıcı kendi yetki kapsamındaki kayıtları görür.

- Seçim, hem Proje Bazlı hem Kişi Bazlı görünümde geçerlidir. Sadece Veri Olanlar açıkken yalnız seçili dönemde girişi olan kayıtlar gösterilir.
- Projeyi gizlemek kayıtları silmez. Aylık toplam, kalan kapasite ve giriş sınırı gizli tamamlanan projelerdeki değerleri de kapsar. Excel çıktısı görünür proje seçimini izler.
- Kaydedilmemiş, hatalı veya henüz tamamlanmamış hücre/çalışılan saat girişi varsa görünüm değişikliği engellenir. Kaydedin veya Escape ile taslağı iptal edin; ardından yeniden deneyin.
- Yalnız tamamlanan proje filtrelendiğinde liste boşsa, **Tamamlanan projeler gizli** mesajındaki düğmeyle kayıtları açabilirsiniz.
- Seçim yeni yetki vermez. Aktivite düzenleme ve geçmiş ay kuralları, çalışanın görevi ve proje dönemiyle sınırlı kalır.

Kişisel izin ve eğitim takvimi

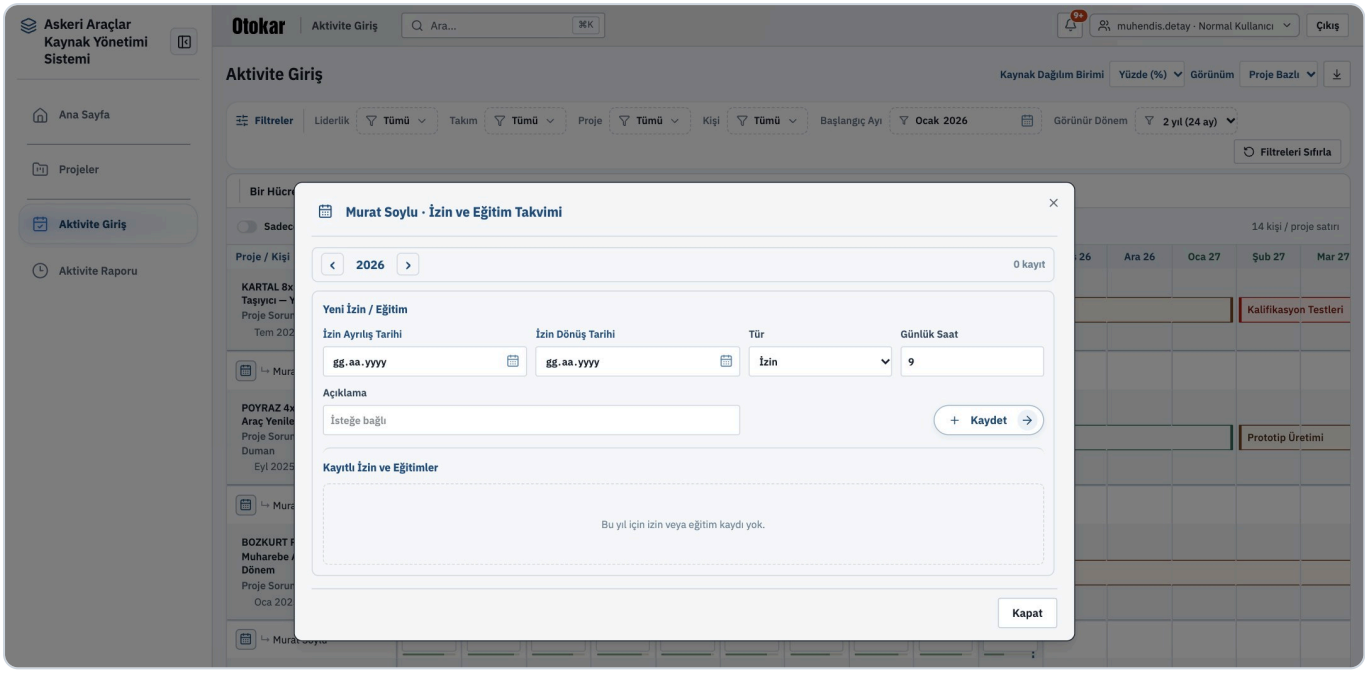

Çalışan adının solundaki takvim simgesiyle açılan İzin ve Eğitim Takvimi.


1. Çalışan adının solundaki takvim simgesine tıklayın; üstteki oklarla yıl değiştirilir.
2. **Yeni İzin / Eğitim** bölümünde **İzin Ayrılış Tarihi**, **İzin Dönüş Tarihi**, **Tür** ve **Günlük Saat** girin; isterseniz **Açıklama** ekleyin. **Kaydet**.
3. Kayıtlar **Kayıtlı İzin ve Eğitimler** listesinde **Düzenle** veya **Sil** ile yönetilir.

> **Dönüş günü hesaba katılmaz.** 12 Ekim ayrılış, 15 Ekim dönüş için 12, 13 ve 14 Ekim değerlendirilir. Hafta sonları ve tatiller atlanır. İzin çalışma saatinden düşer; eğitim dağıtılan süreye eklenir. Günlük saat 0,5–9 aralığındadır.

Takvim simgesi, aktivitesini girebildiğiniz herkes için görünür: çalışanın kendisi, takımının PO'su, liderliğinin Lideri ve Admin izin/eğitim kaydı ekleyip değiştirebilir. Admin tüm kayıtları Organizasyon ekranındaki **Çalışan İzin ve Eğitim Kayıtları** listesinde de görür.

11. Aktivite Raporu

Çalışanların seçili dönemdeki aylık aktivite toplamlarını takım grupları halinde gösterir; yalnız görüntüleme içindir. Düzeltmeler Aktivite Giriş'te veya kişisel takvimde yapılır.

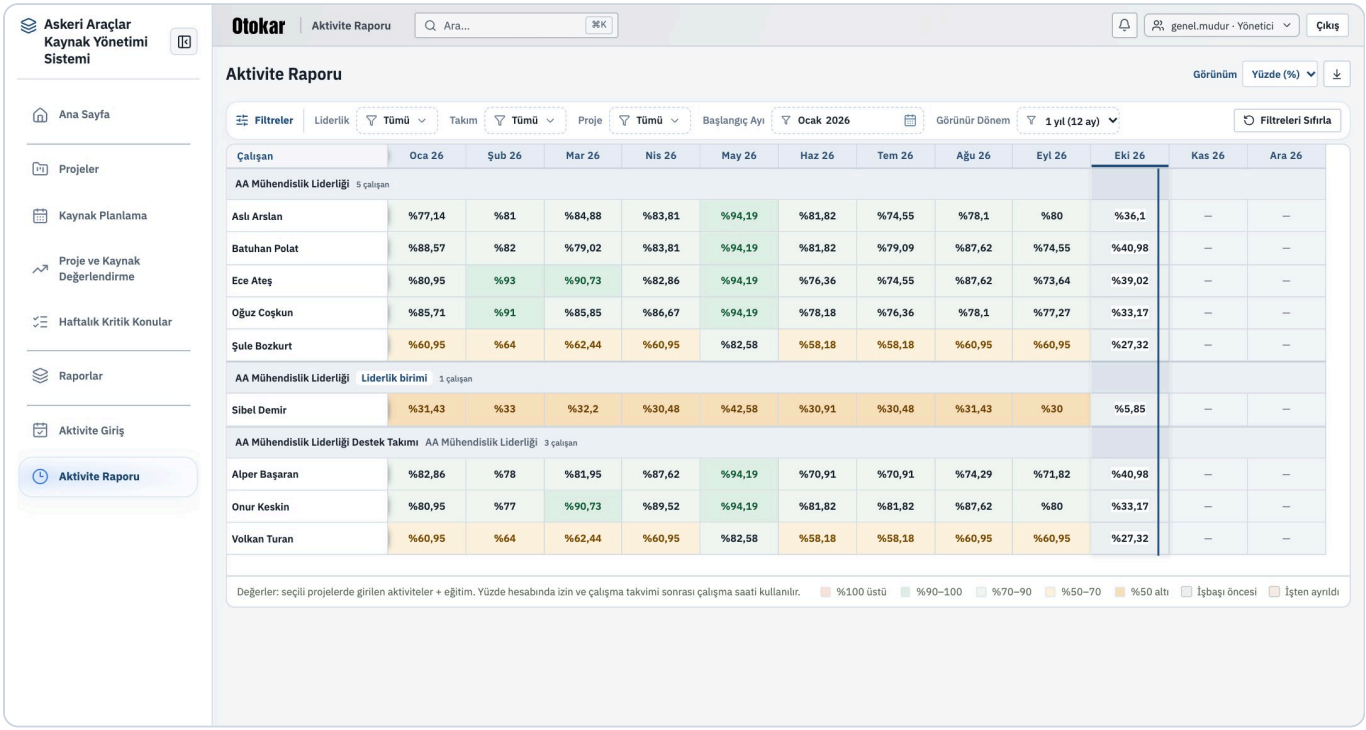


Takım başlıkları altında çalışanlar; hücre rengi aylık doluluğu gösterir.

- **Görünüm**: Yüzde (%) veya Saat. Değerler seçili projelerdeki aktiviteler ile eğitimin toplamıdır; yüzde hesabında izin ve çalışma takvimi sonrası çalışma saati kullanılır.
- **Renk bantları**: %100 üstü · %90–100 · %70–90 · %50–70 · %50 altı. İçinde bulunulan ay ve boş hücreler renklendirilmez; proje filtresi seçiliyken renk kullanılmaz.
- İşbaşı öncesi ve işten ayrılış sonrası aylar ayrıca işaretlenir. Sayfa başına 100 satır gösterilir; **Önceki** / **Sonraki** ile gezilir.
- **Excel'e aktarma**: **Görünüm**'ün sağındaki indirme düğmesi raporu Liderlik, Takım, Çalışan ve aylık değer sütunlarıyla, aynı renk bantlarıyla indirir.
- **Kapsam:** Uygulama rolü Yönetici veya Normal Kullanıcı olsa da çalışan görevi belirleyicidir: Team Member/CoE kendi takımını, Product Owner kendi takımını, Lider kendi liderliğini, alt liderlikleri ve bağlı takımları görür. Admin tümünü görür. Çalışan kaydı eşleşmemiş hesapların raporu boştur (2. bölüm).
- **Takım geçmişi:** Kişinin kendi geçmişi tüm takımlarını kapsar. Diğer çalışanlar için yalnız yetkili olduğunuz takımdaki aylar gösterilir. Takım değişikliği eski ayların görünürlüğünü ve toplamlarını ortadan kaldırmaz.

12. Organizasyon & Çalışan & Yetki

Yalnız Admin içindir. **Çalışan & Yetki Tanımlama** ve **Organizasyon Yapısı** alt sekmeleri vardır.

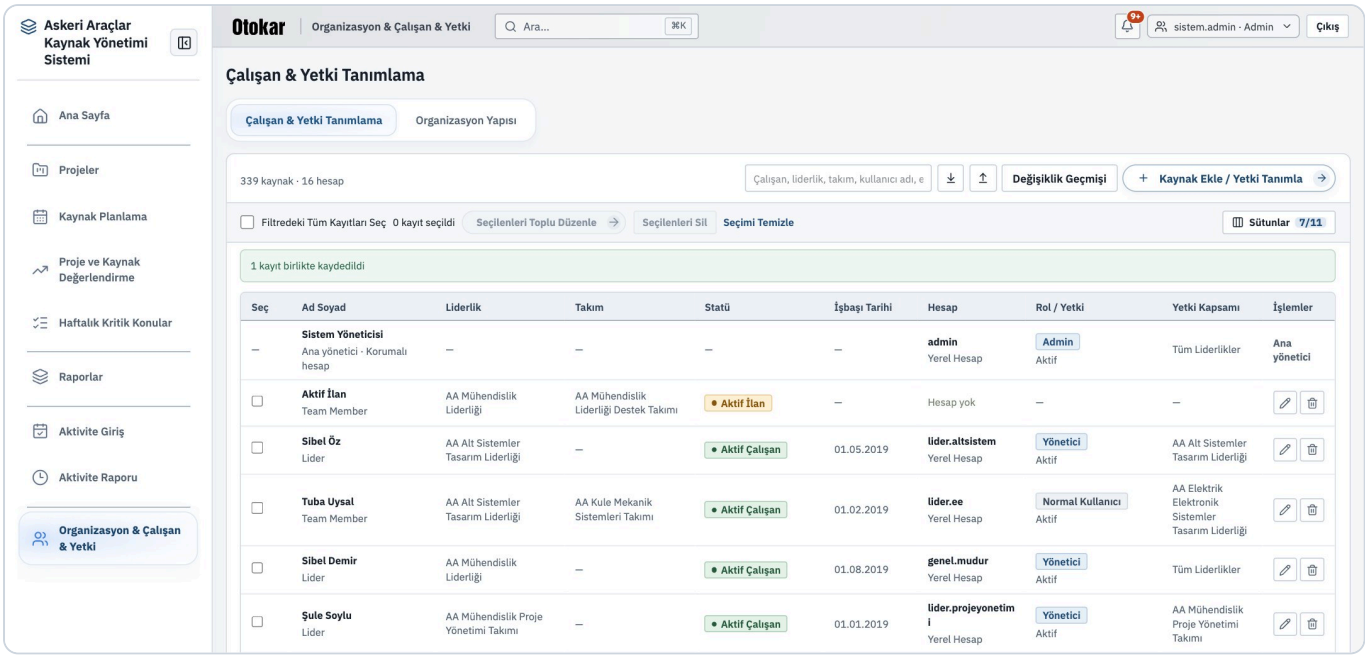


Çalışan listesi: statü, plana dahil bilgisi, tarihler, hesap, rol ve yetki kapsamı. Altta Çalışan İzin ve Eğitim Kayıtları.

- Arama kutusu ad, liderlik, takım, kullanıcı adı veya e-postaya göre süzer. **Sütunlar** isteğe bağlı sütunları gizler/gösterir. Tablo ilk açılışta günlük kullanılan sütunlarla gelir; Kaynak Planına Dahil, İşten Ayrılış Tarihi, E-posta ve Açıklama **Sütunlar → Tümünü Göster** ile açılır. Seçiminiz bu tarayıcıda hatırlanır.
- Satırlar seçilip **Seçilenleri Toplu Düzenle** veya **Seçilenleri Sil** uygulanır; **Filtredeki Tüm Kayıtları Seç** tüm sonucu seçer. Liste 50'şer kayıtlık sayfalarla gezilir.
- Yükleme (↑) düğmesi Excel şablonundan kaynak ekler; önce önizleme gösterir, hesap veya yetki oluşturmaz.
- Geçmişi korumak için çalışanı silmek yerine statüsünü **İşten Ayrıldı** yapın; silme, gerçekleşen kayıtları da kaldırır.
- **Excel çıktıları:** Arama kutusunun yanındaki indirme (↓) düğmesi filtredeki tüm çalışan ve hesapları (tüm sayfalar, tüm sütunlar) indirir. **Çalışan İzin ve Eğitim Kayıtları** tablosunun sağ üstündeki düğme izin/eğitim listesini indirir.

Tüm Kaynak Dağılımlarını Sıfırla: İzin ve eğitim kayıtları tablosunun üstündeki **Kaynak planlama verisi** şeridindedir. Ekran filtresinden bağımsız olarak **tüm liderliklerin, projelerin ve ayların** planlanan kaynak dağılımını temizler; çalışan, kapasite ve proje kayıtları korunur. Uygulama içinden geri alınamaz; işlemden önce kullanıcı menüsünden veri yedeği alın.

Çalışan veya ilan ekleme ve hesap tanımlama

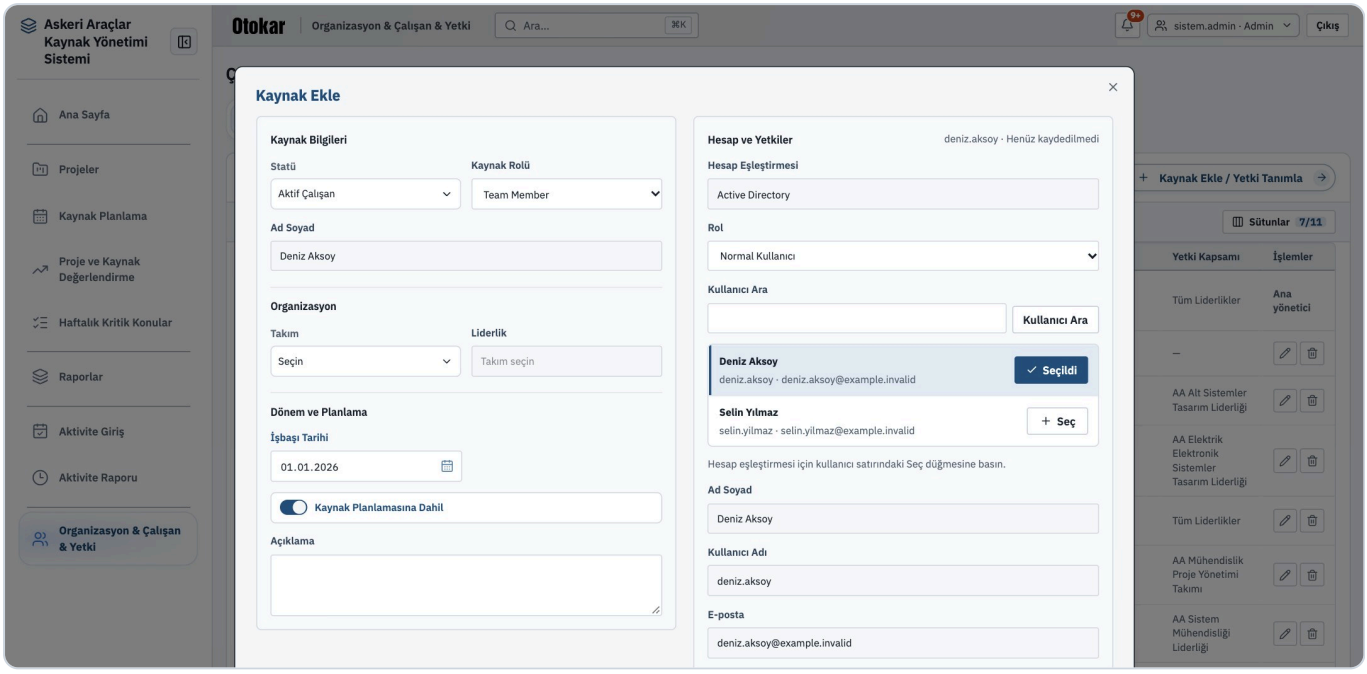


Kaynak Ekle penceresi: solda Kaynak Bilgileri, Organizasyon ve Dönem ve Planlama; sağda Hesap ve Yetkiler.

1. **Kaynak Ekle / Yetki Tanımla** ile **Statü** ve **Kaynak Rolü** seçin. Aktif/Pasif İlan dışındaki yeni kayıtlarda hesap eşleştirmesi otomatik **Active Directory** olur.
2. **Kullanıcı Ara** alanına ad, kullanıcı adı veya e-posta yazıp aynı adlı düğmeye basın. Sonuç satırındaki **Seç** ile tek kullanıcı seçin; başka birini seçmek önceki seçimi değiştirir.
3. **Ad Soyad, Kullanıcı Adı ve E-posta** AD'den gelir; elle değiştirilemez. Aynı kullanıcı adı veya AD hesabı daha önce kayıtlıysa uyarı gösterilir ve Seç kullanılamaz. Mevcut hesabı Düzenle ekranından yönetin.
4. **Takım** seçin; liderlik takımdan gelir. Lider rolünde yalnız liderlik seçilir. Tarihleri ve **Kaynak Planlamasına Dahil** seçimini girin. Hesap **Rol**ünü ve Yönetici için planlama yetkisi ağacını kontrol edin; **Kaydet**.
5. **Uygulama Yetkisini Kaldır**, çalışanı ve AD hesabını silmeden erişimi kapatır. Kullanıcı adı mevcut hesaba bağlı kalır; aynı kişi için ikinci hesap açılmaz.

Statü	Form davranışı
Aktif Çalışan / Gear Up / SAAT Ücretli Ofis Ç.	İşbaşı tarihi zorunludur.
Aktif İlan	Ad ve kaynak rolü istenmez. Statü ilana çevrilince bekleyen AD seçimi otomatik temizlenir; "İlan kaydına hesap tanımlanamaz." görünür. Dahil etmek için tahmini işbaşı tarihi gerekir. İlana hesap tanımlanamaz.
Pasif İlan	Aktif kapasiteye eklenmez; hesap tanımlanamaz.
İşten Ayrıldı	İşbaşı ve ayrılış tarihleri gerekir; eski gerçekleşen kayıtları korunur.

> **AD bağlantısı:** IT tarafından yapılandırılır. Bağlantı kurulmamışsa kurumsal kullanıcı seçilemez. Aynı kullanıcı adını veya AD hesabını yeniden eşleştirme girişimi sunucuda da reddedilir.


Organizasyon Yapısı

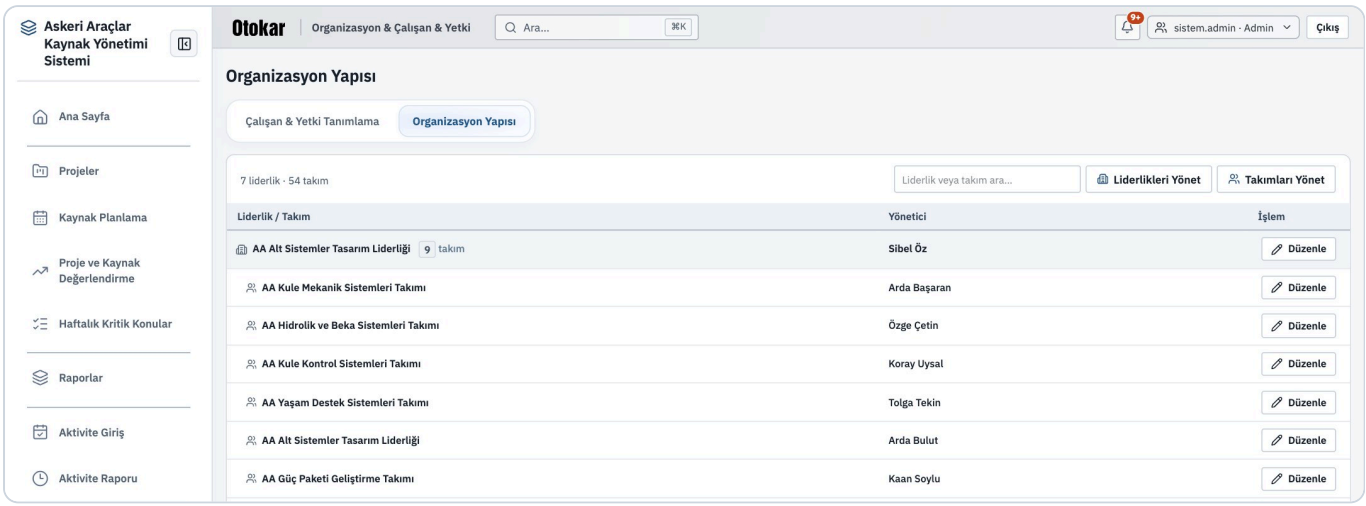

Liderlikler, bağlı takımlar ve yöneticileri.

Liderlikler ve takımlar ile aralarındaki bağlantılar burada düzenlenir. Yönetici adı Lider veya Product Owner atamasından gelir. Bağlı kayıtlar silmeyi engelleyebilir.

Değişiklik Geçmişi ve veri yedeği

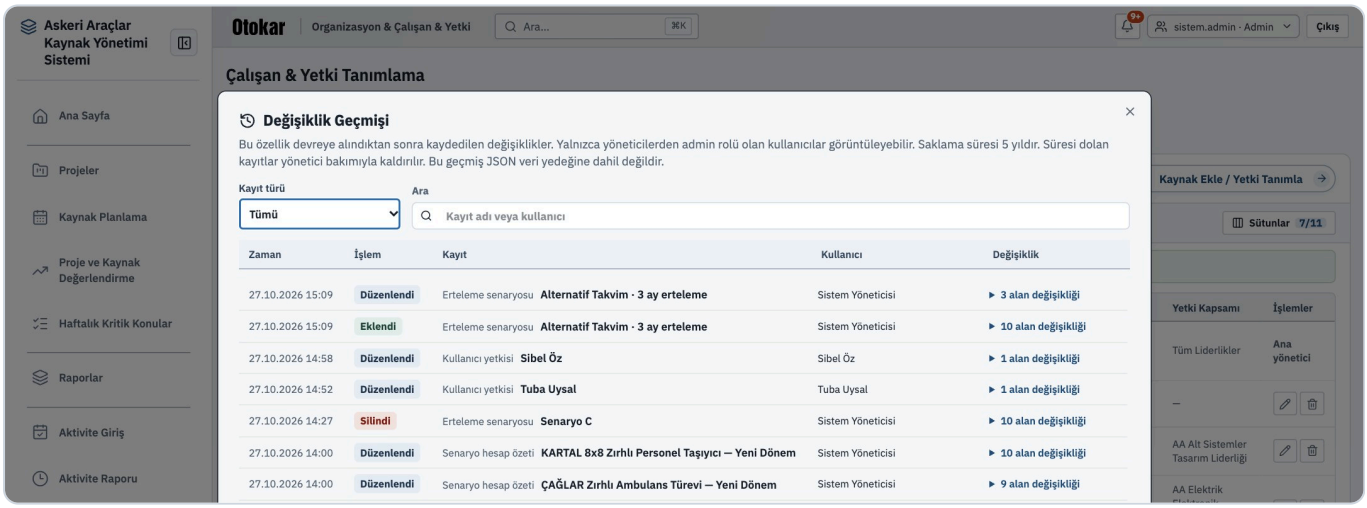

Değişiklik Geçmişi: kayıt türü ve metin filtresi, işlem türü, kullanıcı ve alan değişiklikleri.

- **Değişiklik Geçmişi** kim, ne zaman, hangi kaydı ekledi, düzenledi veya sildi gösterir; satır açılınca eski ve yeni değerler görünür. Kayıtlar 5 yıl saklanır.
- **Veri Yedeği İndir** (kullanıcı menüsü) şifrelenmemiş JSON planlama yedeğidir; hesap ve oturum bilgisi içermez. **Yedek Yükle** mevcut verinin **yerine geçer**, birleştirmez.

13. Yetki matrisi

Düzenler görüntüler ve değiştirir **Kapsamlı** yalnız belirtilen kapsamda **Görür** yalnız görüntüler — erişim yok

13.1 Ekran erişimi

Ekran	Admin	Yönetici	Normal Kullanıcı	Normal-Proje
Projeler / Tamamlanan Projeler	**Düzenler** Tüm projeler	**Görür** Görünür projeler	**Görür** Görünür projeler	**Düzenler** Tüm projeler
Proje Takvimi Güncelle / Onaylanan Takvim Güncellemeleri	**Düzenler** Onay, aktarma, geri alma	**Kapsamlı** Karşılaştırma ve kendi taslakları	—	—
Kaynak Planlama	**Düzenler** Tüm takımlar	**Kapsamlı** Tümünü görür; verilen liderlik/takımı düzenler	—	—
Proje ve Kaynak Değerlendirme	**Düzenler** Onay, ay kilidi, uyarı ayarları	**Kapsamlı** Kendi liderliklerinin hedef ve gerçekleşen girişi	—	—
Haftalık Kritik Konular	**Düzenler**	**Düzenler** Görünür projeler	—	**Düzenler**
Raporlar ve Head Count	**Görür** + Aktif İlanları Dahil Et	**Görür**	—	—
Aktivite Giriş	**Düzenler** Tüm çalışanlar	**Kapsamlı** Çalışan kaydındaki göreve göre: Team Member kendisi, PO takımı, Lider liderliği ve alt liderlikleri		—
Aktivite Raporu	**Görür** Tümü	**Görür** Çalışan görevine göre: Team Member/CoE ve PO kendi takımı; Lider kendi liderliği, alt liderlikler ve bağlı takımlar		—
Organizasyon & Çalışan & Yetki	**Düzenler**	—	—	—

"Görünür projeler": proje görüntüleme yetkisine göre görülebilen projeler (4. bölüm). Arama ve bildirimler de bu kapsamla sınırlıdır.

> Yetkiler sunucu tarafında da denetlenir. Ekranda kilitli görünen bir işlem başka bir yoldan gönderilse bile reddedilir.

13.2 İşlem yetkileri

İşlem	Admin	Yönetici	Normal Kullanıcı	Normal-Proje
Aktivite ve takvim				
Kendi aktivite girişini yapmak	✓	✓ Çalışan kaydı eşleşmişse	✓	—
Başka çalışanın aktivite girişi	✓	Kapsamlı — Uygulama rolünden bağımsız: PO kendi takımını, Lider liderliğini ve alt liderliklerini		—
Başka çalışanın izin / eğitim takvimi	✓	Kapsamlı — Aktivitesini girebildiği kişiler (PO, Lider)		—
Ortak çalışma takvimi	✓	—	—	—
Planlama ve değerlendirme				
Kaynak planlama girişi	✓	Kapsamlı — Verilen liderlik veya takım	—	—
Tüm Kaynak Dağılımlarını Sıfırla, Aktif İlanları Dahil Et	✓	—	—	—
Hedef plan hazırlama, gerçekleşen % girişi	✓	Kapsamlı — Kendi liderlikleri	—	—
Hedef plan onayı, ay kilidi, uyarı ayarları	✓	—	—	—
Takvim uyarısına aksiyon girme	✓	Kapsamlı — Görebildiği projeler	—	—
Senaryo taslağı / onay ve takvime aktarma	✓	Kapsamlı — Yalnız kendi taslağı	—	—
Projeler ve kritik konular				
Proje ekleme, düzenleme, silme, sıralama	✓	—	—	✓
Projeler ekranında aşama, başlık ve kilometre taşı	✓	—	—	✓
Projeyi Tamamlandı işaretleme / yeniden aktif yapma	✓	—	—	✓
Proje görüntüleme yetkisini belirleme	✓	—	—	✓
Kritik konu düzenleme, Tamamlandı, Çıkar	✓	✓ Görünür projeler	—	✓
Yönetim				
Çalışan / ilan, hesap, rol ve yetki tanımlama	✓	—	—	—
AD kullanıcısı seçme ve kullanıcı adıyla hesap eşleştirme	✓	—	—	—
Liderlik/takım yönetimi, Excel'den içe aktarma, Değişiklik Geçmişi, Veri Yedeği İndir / Yedek Yükle	✓	—	—	—
Ortak				
Arama, bildirimler, Excel'e aktarma, varsayılan sekme	✓ Herkes, görebildiği ekranlarda ve verilerle			

14. Sık karşılaşılan durumlar ve sözlük

Durum	Yapılacak işlem
Ekran, çalışan veya proje görünmüyor	Rolünüzü (sağ üst), filtreleri ve proje görüntüleme yetkisini kontrol edin. Gerekirse Admin'den rol veya kapsam isteyin.
Yönetici hesabında Aktivite Giriş veya Aktivite Raporu boş	Admin'den hesabın çalışan kaydıyla eşleşmesini, çalışanın görevini, takımını ve çalışma tarihlerini kontrol etmesini isteyin. Planlama için liderlik yetkisi vermek aktivite kapsamı oluşturmaz.
Hücreye giriş yapılamıyor	Yetki kapsamını, proje dönemini, gelecek ay kısıtını ve ay kilidini kontrol edin.
Toplu seçim yanlış hücreleri kapsıyor	Seçili hücrelerden birine Ctrl'siz tıklayın (seçim o hücreye iner) veya **Esc** ile seçimi kaldırın.
Hedef plan kaydedilmiyor	Yeni hedef, girilmiş gerçekleşen yüzdeden düşük olamaz; ay kilidini ve plan durumunu (Proje Ekibi Onayında ise önce geri çekin) kontrol edin.
Dağılım sınırı uyarısı	Kişinin o aydaki tüm proje saatlerini, eğitim ve izinlerini birlikte kontrol edin.
"Kayıt başka kullanıcı tarafından değiştirildi"	Önce kaydedilmemiş değerlerinizi not edin. Değerlendirme kartında Taslağı İptal Et ile güncel kaydı açın; diğer düzenleyicilerde güncel kaydı yeniden açın. Yeni veri üzerinde düzenleyip kaydedin.
Bağlantı kesildi / sonuç belirsiz	Kaydedilmemiş değerleri not edin. İşlemi hemen tekrarlamayın; bağlantı geldiğinde güncel kaydı kontrol edin. Kaydın ulaşmadığından emin olduktan sonra yeniden deneyin.
AD kullanıcısı seçilemiyor	AD bağlantısını IT'ye doğrulatın. Aynı kullanıcı adı veya AD hesabı kayıtlıysa yeni hesap açmayın; mevcut hesabı Düzenle ile yönetin.
Giriş yapılamıyor	Tekrarlayan denemeleri durdurun; ekran adı, saat ve hata mesajını IT'ye iletin.

Kısa sözlük

Kişi eşdeğeri	Planlama birimi; 1 = bir tam zamanlı kaynak.
Aktif / Dağıtılan / Kalan Kaynak	Kullanılabilir kaynak / projelere planlanan / aradaki fark (negatifse açık).
Hedef plan	Liderliğin projedeki işinin aylık kümülatif tamamlanma hedefi (%).
Sapma	Gerçekleşen % – Hedeflenen % (puan); uyarı eşikleri bu değere göre çalışır.
Ay kilidi	Ayın girişlerini kapatan ve değerlendirmesini oluşturan Admin işlemi.
Aşama / Kilometre taşı	Projenin ay bazındaki evresi / tek tarihli hedef (baklava simgesi).
Head Count	Kişi/adet sayısı.
AD	Kurum kullanıcı dizini (Active Directory).
